

大立 2021 二级建造师章节题(真题版)

《建设工程施工管理》

2Z101000 施工管理

2Z101010 施工方的项目管理

1. 【2020-01】建设工程项目决策期管理工作的主要任务（ ）。
A. 确定项目的定义
B. 明确项目管理团队
C. 实现项目的投资目标
D. 实现项目的使用功能
2. 【2020-02】在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（ ）。
A. 业主方
B. 监理方
C. 施工总承包方
D. 施工总承包管理方
3. 【2019-01】关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（ ）。
A. 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工
B. 不能参与业主的招标和发包工作
C. 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任
D. 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任
4. 【2019-02】施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（ ）。
A. 乙负责组织和管理丙的施工
B. 乙只负责甲与丙之间的索赔工作
C. 乙不参与对丙的组织管理工作
D. 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工
5. 【2018-01】EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。
A. 决策设计-施工-动用前准备
B. 决策-施工-动用前准备-保修期
C. 设计前的准备-设计-施工-动用前准备
D. 设计前的准备-设计施工-动用前准备-保修期
6. 【2018-02】关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。
A. 承担施工任务并对其质量负责
B. 与分包方和供货方直接签订合同
C. 承担对分包方的组织和管理责任
D. 负责组织和指挥总承包单位的施工
7. 【2017-01】对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（ ）。
A. 投资目标
B. 成本目标
C. 财务目标
D. 经营目标
8. 【2017-02】甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理关系的说法，正确的是（ ）。
A. 甲企业只负责完成自己承担的施工任务
B. 丙企业只听从业主的指令
C. 丙企业只听从乙企业的指令
D. 甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工
9. 【2016-01】关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。
A. 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者
B. 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标

- C. 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标
D. 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段
10. 【2016-02】项目设计准备阶段的工作包括（ ）。
- A. 编制项目建议书
B. 编制项目设计任务书
C. 编制项目可行性研究报告
D. 编制项目初步设计
11. 【2015-01】建设工程项目供货方的项目管理主要在（ ）阶段进行。
- A. 施工
B. 设计
C. 决策
D. 保修
12. 【2015-02】建设项目总承包的核心意义在于（ ）。
- A. 合同总价包干降低成本
B. 总承包方负责“交钥匙”
C. 设计与施工的责任明确
D. 为项目建设增值
13. 【2014-01】关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作
B. 施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任
C. 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订
D. 施工总承包方应负责施工资源的供应组织
14. 【2013-01】根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是（ ）。
- A. 编制项目可行性研究报告
B. 编制初步设计
C. 编制设计任务书
D. 编制项目建议书
15. 【2013-02】关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任
B. 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方
C. 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙”
D. 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可
16. 【2020. 12-29】建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验实现建筑生产过程的（ ）。
- A. 连续化
B. 机械化
C. 组织集成化
D. 管理现代化
17. 【2020. 12-30】采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和签订（ ）。
- A. 业主方
B. 分包方
C. 工项目管理公司
D. 施工总承包管理方

2Z101020 施工管理的组织

1. 【2020-03】在工作流程图中，菱形框表示的是（ ）。
- A. 工作
B. 工作执行者
C. 逻辑关系
D. 判别条件
2. 【2020-04】某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，

合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。

- A. 强矩阵组织结构
- B. 弱矩阵组织结构
- C. 职能组织结构
- D. 线性组织结构

3. 【2020-79】下列图表中，属于组织工具的有（ ）。

- A. 项目结构图
- B. 工作任务分工表
- C. 工作流程图
- D. 因果分析图
- E. 管理职能分工表

4. 【2019-03】某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（ ）。

- A. 职能组织结构
- B. 线性组织结构
- C. 强矩阵组织结构
- D. 弱矩阵组织结构

5. 【2019-72】关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。

- A. 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作
- B. 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作
- C. 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作
- D. 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作
- E. 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作

6. 【2018-03】建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。

- A. 提出问题
- B. 决策
- C. 执行
- D. 检查

7. 【2018-04】某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。

- A. 合同管理部
- B. 计划管理部
- C. 财务管理部
- D. 项目管理部

8. 【2018-74】关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（ ）。

- A. 项目结构分解应结合项目规划的整体部署
- B. 项目结构分解应结合项目合同结构的特点
- C. 每一个项目只能有一种项目结构分解方法
- D. 项目结构分解应结合项目组织结构的特点
- E. 单项项目也可进行项目结构分解

9. 【2017-03】某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（ ）。

- A. 检查
- B. 执行
- C. 决策
- D. 计划

10. 【2017-04】某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。


- A. 物质流程组织
- B. 管理工程流程组织
- C. 信息处理工程流程组织
- D. 施工工作流程组织

11. 【2017-73】项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度

的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（ ）。

- A. 提出两种可能加快进度的方案
- B. 确定采用夜间施工加快进度的方案
- C. 复查夜间施工安全条件
- D. 落实夜间施工照明条件
- E. 两者方案的比较分析

12. 【2016-03】某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（ ）。

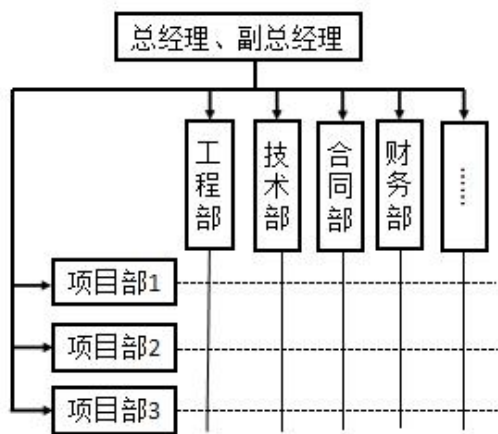

- A. 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主
- B. 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策
- C. 每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源
- D. 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主

13. 【2016-04】当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ）。

- A. 工作任务分工表
- B. 管理职能分工描述书
- C. 岗位职责描述书
- D. 工作任务分工描述书

14. 【2016-95】承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有（ ）。

- A. 管理职能分工表
- B. 工作任务分工表
- C. 工作流程图
- D. 项目结构的编码
- E. 项目结构图


15. 【2015-03】编制项目合同编码的基础是（ ）。

- A. 项目合同文本和项目结构图
- B. 项目结构图和项目结构编码
- C. 项目结构编码和项目组织结构图
- D. 项目合同文本和项目组织结构图

16. 【2015-04】项目管理任务分工表是（ ）的一部分。

- A. 项目组织设计文件
- B. 项目结构分解
- C. 项目工作流程图
- D. 项目管理职能分工

17. 【2015-86】某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（ ）。

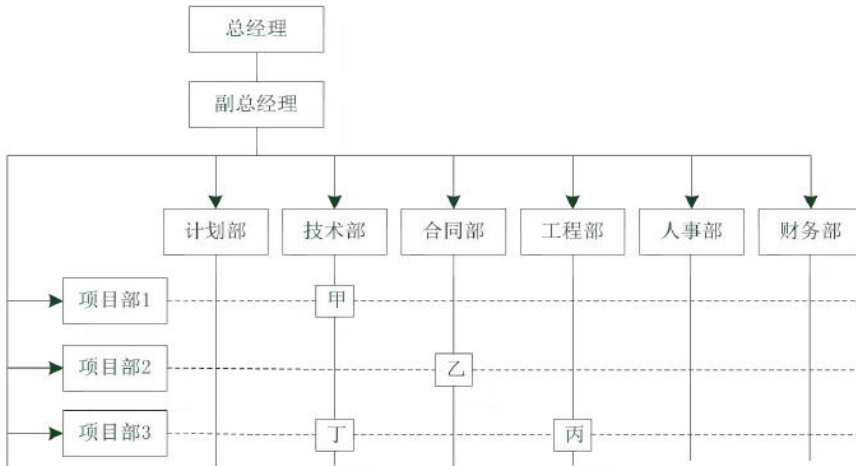

- A. 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令
- B. 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令
- C. 甲工作涉及的指令源有2个，项目部1和技术部
- D. 该组织结构属于矩阵式
- E. 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，必须以合同部指令为主


18. 【2014-02】关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（ ）。

- A. 每一个任务只能有一个主办部门
- B. 每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门
- C. 项目运营部应在项目竣工后介入工作
- D. 项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分

19. 【2014-03】关于线性组织结构的说法，错误的是（ ）。

- A. 每个工作部门的指令源是唯一的
- B. 高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令
- C. 在特大组织系统中，指令路径会很长
- D. 可以避免相互矛盾的指令影响系统运行

20. 【2014-72】根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的有（ ）。

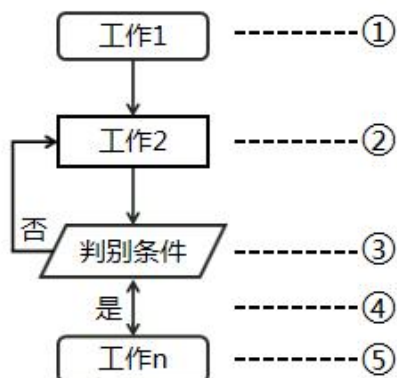

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
- E. ⑤

21. 【2013-03】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（ ）。

- A. 协作
- B. 监督
- C. 指令
- D. 配合

22. 【2013-04】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是（ ）。

- A. 项目结构图 B. 组织结构图 C. 工作流程图 D. 工作任务分工表


23. 【2013-05】工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。

- A. 管理工作流程组织 B. 信息处理工作流程组织
C. 物质流程组织 D. 施工作业流程组织

24. 【2013-71】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（ ）。

- A. 项目结构图中，矩形框表示工作任务 B. 组织结构图中，矩形框表示工作部门
C. 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 D. 组织结构图中，用直线连接矩形框
E. 项目结构图和组织结构图都是组织工具

25. 【2013-72】某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（ ）。

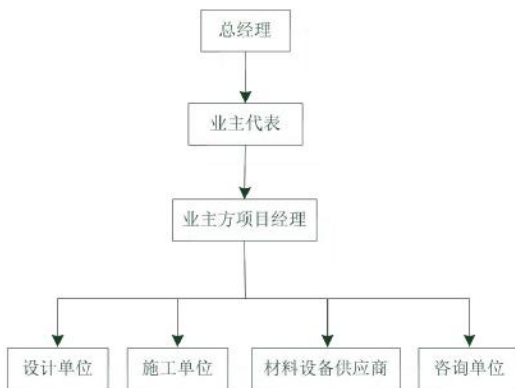

- A. 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 B. 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令
C. 施工单位不可直接接受总经理指令 D. 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令
E. 咨询单位的唯一指令来源是业主项目经理

26. 【2020. 12-32】下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。

- A. 组织措施 B. 管理措施
C. 经济措施 D. 技术措施

【参考答案】A

【大立解析】控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。

【考点来源】2Z101020 施工管理的组织

27. 【2020. 12-31】项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较，这属于管理职能中的（ ）。

- A. 筹划 B. 决策
C. 执行 D. 检查

【参考答案】A

【大立解析】筹划——加快速度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施

工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较。

【考点来源】2Z101024 管理职能分工在项目管理中的应用

28. 【2020. 12-77】建设项目管理常用的组织结构模式有（ ）。

- A. 网络组织结构
- B. 职能组织结构
- C. 多层组织结构
- D. 矩阵组织结构
- E. 线性组织结构

【参考答案】BDE

【大立解析】建设项目管理常用的组织结构模式有：职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构。

【考点来源】2Z101020 施工管理的组织

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法

1. 【2020-05】编制施工组织总设计时，编制投资需求量计划的紧前工作是（ ）。

- A. 拟定施工方案
- B. 编制施工总进度计划
- C. 施工总平面图设计
- D. 编制施工准备工作计划

2. 【2020-89】根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计按编制对象可分为（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 生产用施工组织设计
- D. 投标用施工组织设计
- E. 分部工程施工组织设计

3. 【2019-04】针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单项工程施工组织设计
- C. 单位工程施工组织设计
- D. 分部工程施工组织设计

4. 【2019-87】施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。

- A. 先确定施工总体部署，再拟订施工方案
- B. 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案
- C. 先拟订施工方案，再编制施工总进度计划
- D. 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署
- E. 先编制施工总进度计划，再编制资源需求量

5. 【2018-05】根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。

- A. 编制资源需求计划
- B. 编制施工准备工作计划
- C. 拟订施工方案
- D. 计算主要技术经济指标

6. 【2018-77】建设工程施工组织总设计的编制依据有（ ）。

- A. 相关规范、法律
- B. 合同文件
- C. 施工企业资源配置情况
- D. 建设地区基础资料
- E. 工程施工图纸及标准图

7. 【2017-05】把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使

整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。

- A. 施工部署
- B. 施工方案
- C. 安全施工专项方案
- D. 施工平面图

8. 【2017-77】下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（ ）。

- A. 安排施工顺序
- B. 比选施工方案
- C. 计算主要技术经济指标
- D. 编制施工准备计划
- E. 编制资源需求计划

9. 【2016-54】需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。

- A. 新建居民小区工程
- B. 发电厂干灰库烟囱工程
- C. 工厂整体搬迁工程
- D. 拆除工程定向爆破工程

10. 【2016-93】施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部(分项)工程都具备的内容有（ ）。

- A. 施工部署
- B. 工程概况
- C. 施工进度计划
- D. 主要技术经济指标
- E. 各项资源需求量计划

11. 【2015-05】编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编程序是（ ）。

- A. ⑤-①-②-③-④
- B. ①-⑤-②-③-④
- C. ①-②-③-④-⑤
- D. ⑤-②-③-④-①

12. 【2015-92】施工组织设计的编制原则包括（ ）。

- A. 重视工程施工的目标控制
- B. 合理部署施工现场
- C. 提高施工的工业化程度
- D. 提高施工的连续性和均衡性
- E. 采用国内外最先进的施工技术

13. 【2014-04】下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（ ）。

- A. 工程概况
- B. 施工部署
- C. 施工平面图
- D. 技术经济指标

14. 【2013-06】下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（ ）。

- A. 施工平面图设计
- B. 机具设备需求计划
- C. 施工方案
- D. 施工进度计划

15. 【2013-07】某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单项工程施工组织设计
- C. 单位工程施工组织设计
- D. 分部工程施工组织设计

16. 【2020. 12-33】施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。

- A. 编制施工总进度计划
- B. 施工总平面图设计
- C. 编制施工准备工作计划
- D. 计算主要技术经济指标

17. 【2020. 12-78】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。

- A. 施工方案的选择
- B. 单位工程施工进度计划
- C. 各项资源需求量计划
- D. 项目施工总体部署
- E. 单位工程施工总平面图设计





- ## 2Z101050 施工项目经理的任务和责任

- 10

E. 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法

4. 【2020-93】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。

- A. 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意
- B. 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在 48 小时内向专业监理工程师提交书面报告
- C. 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后 14 天内向发包人提出书面改进报告
- D. 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换
- E. 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前 14 天将授权人员的相关信息通知监理人

5. 【2019-38】某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应（ ）。

- A. 立即向建设主管部门报告
- B. 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告
- C. 在24小时内向发包人代表进行口头报告
- D. 在48小时内向发包人代表提交书面报告

6. 【2019-81】施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。

- A. 项目合同文件
- B. 项目管理实施规划
- C. 组织经营方针
- D. 项目实施条件
- E. 组织管理制度

7. 【2018-45】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（ ）提交书面报告。

- A. 承包方法定代表人和总监理工程师
- B. 发包人代表和总监理工程师
- C. 监督职能部门和承包方法定代表人
- D. 政府职能监督部门和发包人代表

8. 【2018-53】根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。

- A. 施工组织设计
- B. 施工总体规划
- C. 工程承包合同
- D. 项目管理目标责任书

9. 【2018-72】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。

- A. 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理
- B. 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告
- C. 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件
- D. 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任
- E. 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理

10. 【2018-76】在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有（ ）。

- A. 对外进行纳税申报
B. 制定企业经营目标
C. 选择施工作业队伍
D. 组织项目管理班子
E. 指挥工程项目建设的生产经营活动
11. 【2017-28】根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326)，项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。
A. 项目成本管理规划
B. 项目管理承诺书
C. 项目管理目标责任书
D. 质量保证承诺书
12. 【2017-88】关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。
A. 是承包人为实施项目临时聘用的专业人员
B. 是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人
C. 是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者
D. 是施工承包合同中的权利、义务和责任主体
E. 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
13. 【2016-31】关于施工项目经理的地位作用的说法，正确的是（ ）。
A. 项目经理是一种专业人士的名称
B. 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理
C. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人
D. 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理
14. 【2016-77】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GB-2013-0201)，关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。
A. 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明
B. 承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册职业证书编号等事项
C. 项目经理因特殊情况授权下属行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人
D. 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理
E. 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告
15. 【2015-08】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（ ）书面同意。
A. 承包人
B. 监理人
C. 建设主管部门
D. 发包人
16. 【2015-09】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（ ）天书面通知监理人。
A. 5
B. 7
C. 14
D. 28
17. 【2015-83】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GT-2013-0201)》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（ ）。
A. 劳动合同
B. 缴纳社保
C. 身份证
D. 职称证书

E. 注册执业证书

18. 【2014-06】项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权利不包括（ ）。

- A. 组织项目管理班子
- B. 指挥项目的建设的生产经营活动
- C. 签署项目参与人员聘用合同
- D. 选择施工作业队伍

19. 【2014-07】对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。

- A. 企业法定代表人
- B. 项目经理
- C. 项目总工程师
- D. 总监理工程师

20. 【2014-73】关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（ ）。

- A. 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理
- B. 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定
- C. 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任
- D. 项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任
- E. 项目经理不得同时担任其他项目的经理

21. 【2014-74】根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工项目经理应履行的职责有（ ）。

- A. 主持编制项目目标责任书
- B. 对资源进行动态管理
- C. 建立各种专业管理体系
- D. 参与工程竣工验收
- E. 进行授权范围内的利益分配

22. 【2013-09】根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，项目管理目标责任书由（ ）制定。

- A. 施工企业经营部门
- B. 法定代表人或其授权人与项目经理协商
- C. 建设单位和施工企业法定代表人协商
- D. 施工企业合同预算部门

23. 【2013-10】施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（ ）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。

- A. 施工企业决策者
- B. 施工企业法定代表人
- C. 施工企业法定代表人的代表
- D. 建设单位项目管理者

24. 【2020. 12-36】施工企业项目经理的管理权限应由企业（ ）授予。

- A. 董事会
- B. 经理层
- C. 股东大会
- D. 法定代表人

25. 【2020. 12-43】某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。

- A. 追究行政责任
- B. 吊销资格证书
- C. 追究社会责任
- D. 追究经济责任

26. 【2020. 12-71】根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。

- A. 参与组建项目管理机构
- B. 决定授权范围内的项目资源使用
- C. 参与选择大宗资源的供应单位
- D. 决定具有资质的分包人
- E. 主持项目管理机构工作

27. 【2020. 12-75】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目

经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有（ ）。

- A. 发包人要求更换项目经理
- B. 发包人安排另家施工单位进场施工
- C. 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理
- D. 承包人另安排一名生产经理代行项目经理职务
- E. 承包人承担由此增加的费用和延误的工期

2Z101060 施工风险管理

1. 【2020-48】项目风险管理中，风险等级是根据（ ）评估确定的。

- A. 风险因素发生的概率和风险管理能力
- B. 风险损失量和承受风险损失的能力
- C. 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平)
- D. 风险管理能力和风险损失量(或效益水平)

2. 【2019-40】在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的（ ）。

- A. 风险规避
- B. 风险减轻
- C. 风险转移
- D. 风险保留

3. 【2018-66】根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。

- A. 经济与管理
- B. 组织
- C. 工程环境
- D. 技术

4. 【2017-53】某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（ ）。

- A. 经济与管理
- B. 组织
- C. 技术
- D. 工程环境

5. 【2013-74】建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有（ ）。

- A. 分析各种风险的损失量
- B. 确定风险因素
- C. 收集与施工风险相关的信息
- D. 分析各种风险因素发生的概率
- E. 编制施工风险识别报告

6. 【2020.12-52】根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。

- A. 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对
- B. 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任
- C. 风险识别风险评估风险应对、风险监控
- D. 收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控

2Z101070 建设工程监理的工作任务和工作方法

1. 【2020-35】项目监理规划编制完成后，其审核批准者为（ ）。

- A. 监理单位技术负责人
- B. 业主方驻工地代表
- C. 总监理工程师
- D. 政府质量监督人员

2. 【2020-41】项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作（ ）。

- A. 合同执行情况的分析和跟踪管理
B. 定期与施工单位核对签证台账
C. 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工
D. 审查单位工程施工组织设计
3. 【2019-44】根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是（ ）。
- A. 承包人应在施工前24小时书面通知监理方
B. 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划
C. 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督
D. 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工
4. 【2019-54】根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是（ ）。
- A. 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门
B. 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收
C. 参与工程预验收并编写工程质量评估报告
D. 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见
5. 【2018-12】根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
- A. 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改
B. 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告
C. 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告
D. 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
6. 【2018-58】根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构
B. 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序
C. 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令
D. 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理
7. 【2017-37】工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。
- A. 要求施工单位报告设计单位改正
B. 报告建设单位要求设计单位改正
C. 直接与设计单位确认修改工程计划
D. 要求施工单位改正并报告设计单位
8. 【2017-63】根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。
- A. 签订委托监理合同
B. 召开第一次工地会议
C. 签发工程开工令
D. 业主组织施工招标
9. 【2016-26】对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。
- A. 工程建设监理实施方案
B. 工程建设监理大纲

- C. 工程建设监理实施细则 D. 工程建设监理实施规划
10. 【2016-56】专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。
- A. 要求设计院进行设计变更 B. 下达设计整改通知时
C. 下达停工令 D. 报告建设单位要求设计单位改正
11. 【2015-13】根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（ ）。
- A. 建设工程承包合同 B. 工程监理大纲 C. 设计文件 D. 工程建设强制性标准
12. 【2015-41】根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（ ）。
- A. 工程总承包单位 B. 建设主管部门 C. 质量监督站 D. 建设单位
13. 【2014-09】根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（ ）。
- A. 旁站、巡视和班组自检 B. 巡视、平行检验和班组自检
C. 旁站、巡视和平行检验 D. 平行检验、班组互检和旁站
14. 【2014-10】我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（ ）。
- A. 确保工程建设质量 B. 加快工程建设速度 C. 提高工程建设水平 D. 充分发挥投资效益
15. 【2013-13】工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。
- A. 业主 B. 总监理工程师 C. 专业监理工程师 D. 监理单位技术负责人
16. 【2013-14】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。
- A. 工程建设设计文件 B. 工程建设强制性标准
C. 工程建设施工合同 D. 工程建设技术规程
17. 【2020. 12-44】某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（ ）。
- A. 直接给承包人下发设计变更单 B. 直接要求设计人更正
C. 要求承包人提出变更建议 D. 报告建设单位要求设计人更正
18. 【2020. 12-18】根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法（试行）》，施工单位在需要旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ ）小时，书面通知项目监理机构。
- A. 12 B. 36
C. 24 D. 48

2Z102000 施工成本管理

2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算

1. 【2020-15】企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（ ）。
- A. 企业管理费 B. 规费
C. 税金 D. 财产保费

2. 【2020-66】现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（ ）。
- A. 项目应纳税所得额
B. 增值税可抵扣进项税额
C. 增值税销项税额
D. 增值税进项税
3. 【2020-90】下列施工费用中，属于施工机具使用费的有（ ）。
- A. 塔吊进入施工现场的费用
B. 挖掘机施工作业消耗的燃料费用
C. 压路机司机的工资
D. 通勤车辆的过路过桥费
E. 土方运输汽车的年检费
4. 【2019-70】某建设工程项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润为800万元，规费为300万元，各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%。则增值税销项税额为（ ）万元。
- A. 1035
B. 900
C. 936
D. 1008
5. 【2019-71】下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。
- A. 运杂费
B. 运输损耗费
C. 采购费
D. 工地保管费
E. 检验试验费
6. 【2018-26】根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。
- A. 奖金
B. 计时工资或计件工资
C. 津贴补贴
D. 特殊情况下支付的工资
7. 【2017-20】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。
- A. 措施费
B. 规费
C. 材料费
D. 企业管理费
8. 【2016-78】其他项目清单包含的内容有（ ）。
- A. 暂列金额
B. 总承包服务费
C. 安全文明施工费
D. 暂估价
E. 计日工
9. 【2015-35】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（ ）元/吨。
- A. 3245.13
B. 3244.50
C. 3240.00
D. 3150.00
10. 【2014-11】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（ ）。
- A. 检验试验费
B. 总承包服务费
C. 施工机具使用费
D. 工程定位复测费
11. 【2014-75】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），按建造形成划分，属于措施项目费的有（ ）。

- A. 特殊地区施工增加费 B. 工程定位复测费
C. 安全文明施工费 D. 脚手架工程费
E. 仪器仪表使用费
13. 【2013-16】根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的（ ）。
A. 文明施工费 B. 劳动保险费 C. 规费 D. 安全施工费
14. 【2020. 12-26】建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输装卸、辅助材料及架线等费用属于（ ）。
A. 施工机械使用费 B. 大型机械设备进出场及安拆费
C. 工具用具使用费 D. 固定资产使用费
15. 【2020. 12-92】下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（ ）。
A. 环境保护费 B. 脚手架工程费
C. 工程定位复测费 D. 冬雨期施工增加费
E. 临时设施费
16. 【2020. 12-54】某建筑材料的原价是 3500 元/吨，运杂费率是 2.5%，运输损耗率是 1%，采购保管费率是 2%该材料的不含税单价是（ ）元/吨。
A. 3692.50 B. 3695.84
C. 3694.08 D. 3694.95
17. 【2020. 12-56】根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。
A. 暂列金额应按招标工程量清单的数量填写，施工中由承包人自行使用
B. 专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用
C. 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行
D. 计日工应按招标工程量清单中的项目和数量，由投标人自主报价

2Z102020 建设工程定额

1. 【2020-21】编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的定额制定方法是（ ）。
A. 统计分析法 B. 比较类推法
C. 技术测定法 D. 经验估计法
2. 【2020-60】施工定额的研究对象是（ ）。
A. 工序 B. 分项工程
C. 分部工程 D. 单位工程
3. 【2020-72】下列机械消耗时间中，属于施工机械时间定额组成的有（ ）。
A. 不可避免的中断时间 B. 机械故障的维修时间
C. 正常负荷下的工作时间 D. 不可避免的无负荷工作时间
E. 降低负荷下的工作时间
4. 【2019-32】编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施

工过程，宜采用的编制方法是（ ）。

- A. 比较类推法 B. 技术测定法 C. 统计分析法 D. 试验测定法

5. 【2019-39】施工企业投标报价时，周转消耗量应按（ ）计算。

- A. 一次使用量 B. 摊销量 C. 每次的补给量 D. 损耗率

6. 【2019-84】编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。

- A. 领取工具和材料的时间 B. 制备砂浆的时间
C. 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D. 结束工作时清理和返还工具的时间
E. 闲聊和打电话的时间

7. 【2018-71】影响建设工程周转性材料消耗的因素有（ ）。

- A. 第一次制造时的材料消耗 B. 施工工艺流程
C. 每周转使用一次时的材料损耗 D. 周转使用次数
E. 周转材料的最终回收和回收折价

8. 【2017-09】某出料容量 0.5m^3 的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ） $\text{m}^3/\text{台班}$ 。

- A. 32 B. 36 C. 40 D. 50

9. 【2016-06】施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（ ）计算。

- A. 周转使用次数 B. 摊销量
C. 每周转使用一次的损耗量 D. 一次使用量

10. 【2016-18】关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位
B. 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据
C. 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据
D. 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些

11. 【2016-65】对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是（ ）。

- A. 经验估算法 B. 技术测定法 C. 统计分析法 D. 比较类推法

12. 【2015-18】施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（ ）。

- A. 工序 B. 分部工程 C. 分项工程 D. 整个建筑物

13. 【2015-23】编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1 小时的生产率为 6m^3 ，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8 小时，则该机械的台班产量定额为（ ） m^3 。

- A. 64 B. 60 C. 48 D. 38.4

14. 【2015-78】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（ ）。

- A. 第一次制造时的材料消耗量 B. 每周转使用一次材料的损耗
C. 周转使用次数 D. 周转材料的最终回收及其回收折价
E. 材料的测算方法

- C. 确定人、料、机单价 D. 确定组合定额子目
3. 【2019-22】关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（ ）。
- A. 清单项目与定额子目之间是一一对应的
B. 一个定额子目不能对应多个清单项目
C. 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的
D. 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目
4. 【2019-45】根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应（ ）。
- A. 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据
B. 以设计图纸作为报价依据
C. 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据
D. 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价
5. 【2018-29】某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³，投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。
- A. 29.88 B. 47.80 C. 42.40 D. 44.60
6. 【2018-47】根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。
- A. 施工中发生设计变更增加的费用
B. 业主提供了暂估价的材料采购费用
C. 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D. 因施工缺陷造成的工程维修费用
7. 【2018-88】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。
- A. 其他项目费 B. 企业管理费 C. 规费 D. 利润 E. 税金
8. 【2017-84】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含（ ）。
- A. 企业管理费 B. 利润 C. 税金 D. 规费 E. 措施费
9. 【2016-14】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)，投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。
- A. 夜间施工增加费 B. 已完工程保护费
C. 安全文明施工费 D. 冬雨季施工增加费
10. 【2015-44】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标人采用定额编制综合单价的说法，正确的是（ ）。
- A. 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等
B. 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整
C. 一个清单项目可能对应多个定额子目

D. 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整

11. 【2014-13】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标价编制原则的说法，正确的是（ ）。

- A. 投标报价只能由投标人自行编制
- B. 投标报价不得低于工程成本
- C. 投标报价可以另行设定情况优惠总价
- D. 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用

12. 【2020. 12-01】根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。

- A. 规费、税金和企业管理费
- B. 安全文明施工费、规费和风险费用
- C. 规费、利润和税金
- D. 安全文明施工费、规费和税金

2Z102040 计量与支付

1. 【2020-32】根据《标准施工招标文件》承人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以提出（ ）索赔。

- A. 费用和利润
- B. 费用和工期
- C. 风险费和利润
- D. 工期和风险费

2. 【2020-61】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。

- A. 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查
- B. 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担
- C. 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生费用由承包人承担
- D. 发包人应在开工后 42 天内预付安全文明工费总额的 50%

3. 【2020-94】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（ ）。

- A. 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担
- B. 永久工程损失由发包人承担
- C. 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担
- D. 承包人施工机械损坏由发包人承担
- E. 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

4. 【2019-30】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是（ ）。

- A. 提出措施项目变化后增加费用的估算
- B. 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据
- C. 加快施工尽快完成措施项目
- D. 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况

5. 【2019-58】根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（ ）。

- A. 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算
- B. 由建设单位掌握使用，若有余额，则归建设单位
- C. 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管

- D. 由建设单位估算金额，承包单位负责使用，余额双方协商处理
6. 【2019-68】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日前（ ）天作为基准日。
- A. 7 B. 14 C. 28 D. 42
7. 【2019-85】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。
- A. 所有已经支付的现场签证 B. 竣工结算合同价格
C. 发包人已支付承包人的款项 D. 应扣留的质量保证金
E. 发包人应支付承包人的合同价款
8. 【2018-70】某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，导致承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班；挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。
- A. 4800 B. 5200 C. 5400 D. 5800
9. 【2017-68】某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（ ）。
- A. 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B. 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C. 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D. 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
10. 【2016-05】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。
- A. 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低
B. 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高
C. 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高
D. 当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低
11. 【2016-58】某工程由于业主方征地拆迁没有按期完成，监理工程师下令暂停施工一个月，独立承包人除提出人工费、材料费、施工机械使用费索赔外，还可以索赔的费用是（ ）。
- A. 现场管理费、保险费、保函手续费、利息、企业管理费
B. 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、措施项目费
C. 保险费、保函手续费、利息、企业管理费、安全文明施工费
D. 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、分包费用
12. 【2015-60】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它

因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。

- A. 36625 B. 35000 C. 33750 D. 32875

13. 【2014-17】关于总价合同计量的说法，正确的是（ ）。

- A. 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定
B. 采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
C. 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告
D. 发包人应在收到工程量计量报告后 14 天内进行复核

14. 【2014-18】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于暂列金额的说法，正确的是（ ）。

- A. 已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用
B. 已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用
C. 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有
D. 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

15. 【2014-19】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（ ）。

- A. 有权提出费用及利润补偿 B. 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿
C. 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 D. 无权要求任何费用和利润补偿

16. 【2020. 12-81】下列资料中属于单价合同计量依据的有（ ）。

- A. 设计概算 B. 质量合格证书
C. 设计图纸 D. 《计量规范和技术规范》
E. 类似项目的计量资料

17. 【2020. 12-11】根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为 20 个月，合同工期为 18 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前 1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。

- A. 发包人要求的合同工期比定额工期提前了 1 个月竣工应承担提前竣工 3 个月的赶工费用
B. 发包人要求工程提前 1 个月竣工，应承担提前竣工 1 个月的赶工费用
C. 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的 20%，应承担提前竣工 3 个月的赶工费用
D. 发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期 10%，不支付赶工费用

18. 【2020. 12-25】根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。

- A. 增加的费用和延误的工期均由承包人承担 B. 增加的费用和延误的工期均由发包人承担
C. 费用由承包人承担，工期由发包人承担 D. 费用由发包人承担，工期由承包人承担

19. 【2020. 12-68】根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是（ ）。

- A. 承包人应在发生现场签证事件的 14 天内向发包人提出签证
- B. 发包人未签证同意, 承包人自行施工后发生争议的, 责任由双方共同承担
- C. 发包人应在收到承包人的签证报告 7 天内给予确认或提出修改意见
- D. 发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付

2Z102050 施工成本管理的任务、程序和措施

1. 【2020-10】根据成本管理的程序, 进行项目过程成本分析的紧后工作是 ()。
 - A. 编制项目成本计划
 - B. 进行项目成本控制
 - C. 编制项目成本报告
 - D. 进行项目过程成本考核
2. 【2020-67】下列施工成本管理措施中, 属于经济措施的是 ()。
 - A. 做好施工采购计划
 - B. 选用合适的合同结构
 - C. 确定施工任务单管理流程
 - D. 分解成本管理目标
3. 【2020-88】下列施工成本管理措施中, 属于技术措施的有 ()。
 - A. 加强施工任务单管理
 - B. 确定最佳的施工方案
 - C. 进行材料使用的比选
 - D. 使用先进的机械设备
 - E. 加强施工调度
4. 【2019-21】下列建设工程项目成本管理的任务中, 作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制 and 核算的基础是 ()。
 - A. 成本预测
 - B. 成本计划
 - C. 成本考核
 - D. 成本分析
5. 【2019-79】下列施工成本管理的措施中, 属于技术措施的有 ()。
 - A. 落实各种变更签证
 - B. 确定合适的施工机械、设备使用方案
 - C. 在满足功能要求下, 通过改变配合比降低材料消耗
 - D. 加强施工调度, 避免物料积压
 - E. 确定合理的成本控制工作流程
6. 【2018-33】对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是 ()。
 - A. 评价财务管理效果
 - B. 核算企业经营效益
 - C. 考核项目管理绩效
 - D. 评价项目成本效益
7. 【2017-14】施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是 ()。
 - A. 项目经理部和企业财务部门
 - B. 项目经理部和项目经理部
 - C. 企业财务部门和企业财务部门
 - D. 企业财务部门和项目经理部
8. 【2017-29】项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量, 属于成本管理措施中 ()。
 - A. 经济措施
 - B. 组织措施
 - C. 合同措施
 - D. 技术措施
9. 【2016-82】下列施工成本管理措施中, 属于经济措施的有 ()。
 - A. 使用添加剂降低水泥消耗
 - B. 选用合适的合同结构
 - C. 及时落实业主签证
 - D. 采用新材料降低成本

E. 通过偏差分析找出成本超支潜在问题

10. 【2014-20】施工成本偏差的控制，其核心工作是（ ）。

- A. 成本分析 B. 成本考核 C. 纠正偏差 D. 调整成本计划

11. 【2013-24】通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（ ）。

- A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施

12. 【2020. 12-70】项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为（ ）。

- A. 项目管理机构 B. 施工企业财务部门
C. 第三方咨询机构 D. 建设单位财务部门

13. 【2020. 12-28】项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制；②进行项目过程成本分析；③编制项目成本报告；④进行项目过程成本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（ ）。

- A. ⑤-②-①-③-④ B. ⑤-①-②-④-③
C. ①-⑤-②-③-④ D. ⑤-①-③-②-④

14. 【2020. 12-76】编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。

- A. 集中管理，以生产部门为编制主体
B. 从实际情况出发，挖掘内部潜力
C. 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标
D. 以先进的技术经济指标为编制依据
E. 留有一定的余地，保持计划的弹性

2Z102060 施工成本计划和成本控制

1. 【2020-26】编制施工项目实施性成本计划的主要依据是（ ）。

- A. 项目投标报价 B. 项目所在地造价信息
C. 施工预算 D. 施工图预算同

2. 【2020-59】项目施工成本的过程控制程序主要包括（ ）。

- A. 管理控制程序和评审控制程序 B. 管理行为控制程序和指标控制程序
C. 管理人员激励程序和指标控制程序 D. 管理行为控制程序和目标考核程序

3. 【2019-13】对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是 100m^3 ，计划单价为 $300\text{元}/\text{m}^3$ ；当月实际完成工作量是 120m^3 ，实际单价为 $320\text{元}/\text{m}^3$ 。则关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 费用偏差为 -2400元 ，成本超支 B. 费用偏差为 6000元 ，成本节约
C. 进度偏差为 6000元 ，进度延误 D. 进度偏差为 2400元 ，进度提前

$SV = BCWP - ACWP = 36000 - 30000 = 6000$ ； $SV < 0$ ，进度延误； $SV > 0$ ，进度提前。

4. 【2019-48】采用时间-成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间宜按（ ）确定。

- A. 最迟开始时间 B. 最早开始时间

C. 最迟完成时间减干扰时差

D. 最早完成时间加自由时差

5. 【2018-24】采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。

A. 所有工作均按最早开始时间开始

B. 关键工作均按最迟开始时间开始

C. 关键工程均按最早开始时间开始

D. 所有工作均按最迟开始时间开始

6. 【2018-37】某分项分部工程预算单价为300元/m³，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月(匀建)完成工程量160 m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（ ）元。


A. 4800

B. -4800

C. 18000

D. -18000

7. 【2017-27】某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（ ）。

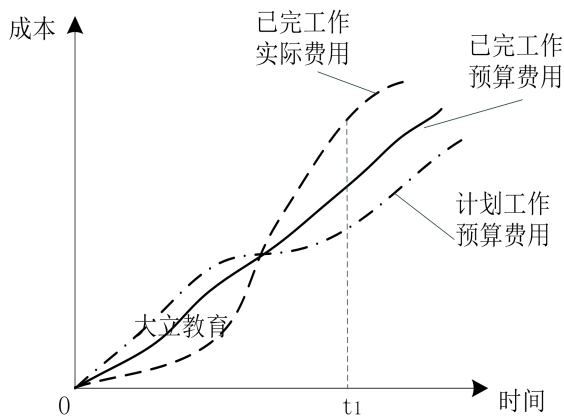

A. 费用节约、进度超前

B. 费用超支、进度拖延

C. 费用节约、进度拖延

D. 费用超支、进度超前

8. 【2017-48】某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（ ）。

A. 业主原因

B. 设计原因

C. 施工原因

D. 客观原因

9. 【2017-60】关于用时间-成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（ ）。

A. 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出

B. 全部工作必须按照最早开始时间安排

C. 全部工作必须按照最迟开始时间安排

D. 可缩短关键工作的持续时间以降低成本

10. 【2017-93】某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m³，计划工程量是8000m³。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m³，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m³。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（ ）。

A. 已完工作预算费用360万元

B. 费用偏差为90万元，费用节省

C. 进度偏差为40万元，进度拖延

D. 已完工作实际费用为450万元

E. 计划工作预算费用为320万元

11. 【2016-13】某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开挖土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元


A. 18

B. -16

C. -18

D. 16

12. 【2016-57】某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同，关于该工程施工成本的说法，正确的是（ ）。

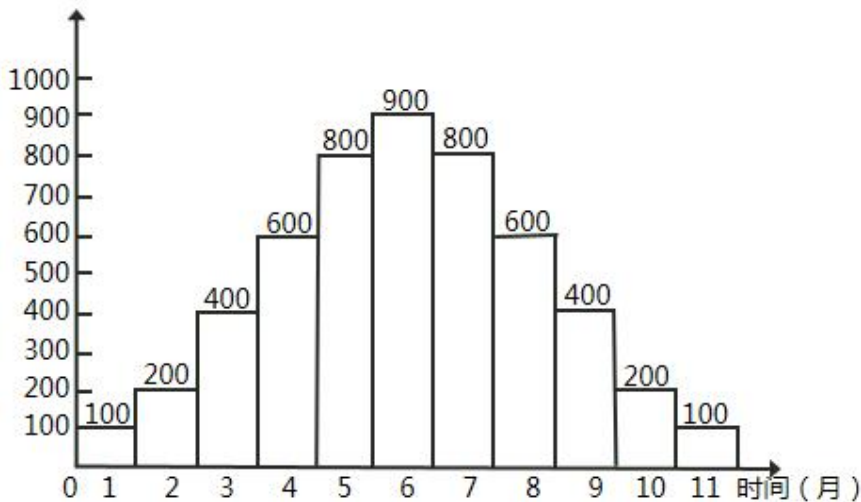

A. 第6月末计划成本累计值为3100万元

B. 第8月末计划成本累计值为4500万元

C. 第8月末计划成本累计值为4600万元

D. 第6月末计划成本累计值为3000万元

13. 【2016-72】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（ ）。

A. 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果

B. 理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升

C. 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度

D. 费用(进度)偏差适用于在同一项目和不同项目比较中采用

E. 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点

14. 【2015-32】关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。

A. 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利

B. 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

C. 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内

D. 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

15. 【2015-71】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（ ）。

A. 最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升


B. 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重

C. 如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题

D. 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点

E. 同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的

16. 【2015-73】某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有（ ）。

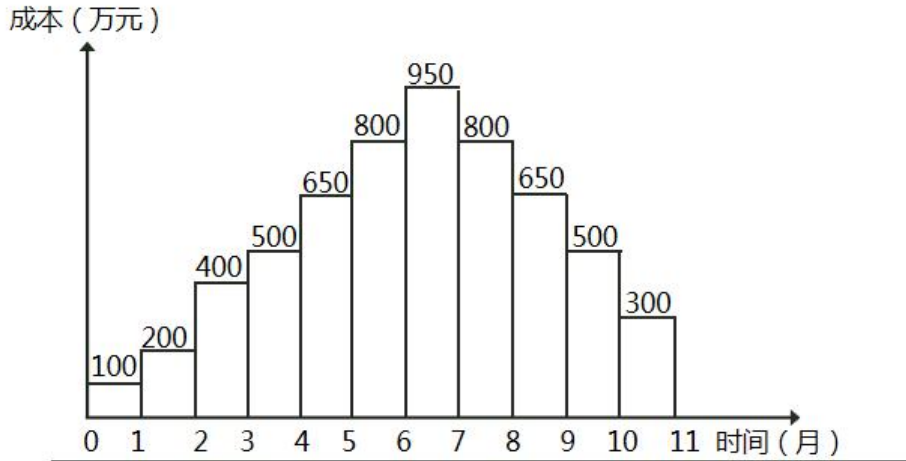

- A. 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 B. 第6个月末的实际成本累计值为2550万元
C. 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 D. 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算
E. 第7个月末的实际成本累计值为3550万元

17. 【2014-22】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（ ）。

- A. 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略
B. 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细
C. 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划
D. 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的

18. 【2014-25】某土方工程，月计划工程量2800m³，预算单价25元/m³；到月末时已完成工程量3000m³，实际单价26元/m³。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 已完成工作实际费用为75000元
B. 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用
C. 费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用
D. 进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后

19. 【2013-23】某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（ ）万元。

编码	项目名称	时间 (周)	费用强度 (万元/周)	工程进度 (周)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	场地平整	1	20												
12	土方开挖	4	30												
13	基础垫层	4	45												
14	混凝土基础	6	80												
15	土方回填	3	30												

- A. 75 B. 80 C. 125 D. 155

20. 【2013-26】某工程某月计划完成工程100根，计划单价为1.3万元/根。实际完成工程110根，实际单价为1.4万元/根。则费用偏差(CV)为()万元。

- A. 11 B. 13 C. -11 D. -13

21. 【2013-79】用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。

- A. 已完工作预算费用 B. 计划工作预算费用
C. 已完成工作实际费用 D. 计划工作实际费用
E. 费用绩效指数

22. 【2020.12-46】项目经理部采用时间-成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是()。

- A. 压缩非关键线路上工作的时间 B. 所有工作都按最早开始时间开始
C. 所有工作都按最迟开始时间开始 D. 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力

23. 【2020.12-47】某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9。据此判断该项目的实际状况是()。

- A. 进度延误，费用超支 B. 进度提前，费用节约
C. 进度延误，费用节约 D. 进度提前，费用超支

2Z102070 施工成本核算、成本分析和成本考核

1. 【2020-18】施工项目综合成本分析的基础是()。

- A. 分部分项工程成本分析 B. 月度成本分析
C. 年度成本分析 D. 单位工程成本分析

2. 【2020-22】根据《企业会计准则》，下列费用中，属于间接费用的是()。

- A. 材料装卸保管 B. 周转材料摊销费
C. 施工场地清理费 D. 项目部的固定资产折旧费

3. 【2019-55】关于施工企业年度成本分析的说法，正确的是()。

- A. 分析的依据是年度成本报表
B. 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年
C. 分析应以本年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目
D. 分析应以本年度竣工验收的项目为对象，不含本年度未完工的项目

4. 【2019-90】关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有()。

- A. 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积
B. 投标报价来自预算成本
C. 预算成本来自投标报价
D. 目标成本来自施工预算
E. 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额

5. 【2018-20】某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成

本的影响是（ ）元。

项目	单位	计划值	实际值
产品产量	件	180	200
单位产品人工消耗量	工日/件	12	11
人工单价	元/工日	100	110

- A. -20000 B. -18000 C. -19800 D. -22000

6. 【2018-60】对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。

- A. 月(季)度成本分析 B. 年度成本分析
C. 分部分项工程成本分析 D. 施工成本分析

7. 【2018-89】建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。

- A. 施工工程实际成本 B. 施工成本降低
C. 施工成本降低率 D. 局部成本偏差
E. 累计成本偏差

8. 【2017-94】关于施工成本核算的说法，正确的有（ ）。

- A. 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步
B. 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制
C. 竣工工程完成成本用于考核项目管理绩效
D. 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础
E. 施工成本一般以单位工程为成本核算对象

9. 【2015-49】施工项目成本分析的基础是（ ）成本分析。

- A. 工序 B. 分部分项 C. 单项工程 D. 单位工程

10. 【2014-23】关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程
B. 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础
C. 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算
D. 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比

11. 【2020. 12-10】关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。

- A. 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算
B. 业务核算是价值核算，会计核算的范围业务核算的范围更广
C. 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量
D. 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

12. 【2020. 12-22】关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 运距长短对于材料费没有直接影响

- B. 材料费分析中不应考虑材料的保管费
- C. 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量
- D. 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少

2Z103000 施工进度管理

2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务

1. 【2020-44】项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划；④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（ ）。
 - A. ④-①-③-②
 - B. ①-④-③-②
 - C. ②-④-③-①
 - D. ③-②-①-④
2. 【2020-62】下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（ ）。
 - A. 控制设计准备阶段的工作进度
 - B. 编制施工图设计进度计划
 - C. 调整初步设计小组的人员
 - D. 确定设计总说明的编制时间
3. 【2020-78】项目实施阶段的总进度包括（ ）工作进度。
 - A. 可行性研究
 - B. 设计
 - C. 招标
 - D. 工程物资采购
 - E. 工程施工
4. 【2019-35】关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是（ ）。
 - A. 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统
 - B. 同一个项目进度计划系统的组成不变
 - C. 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联
 - D. 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统
5. 【2019-56】建设工程项目进度计划按编制的深度可分为（ ）。
 - A. 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划
 - B. 里程碑表、横道图计划、网络计划
 - C. 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划
 - D. 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划
6. 【2018-18】根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层(各级)进度计划的紧前工作是（ ）。
 - A. 确定项目的工作编码
 - B. 调查研究和资料收集
 - C. 进行项目结构分析
 - D. 进行进度计划系统的结构分析
7. 【2018-73】大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。
 - A. 项目实施总体部署
 - B. 总进度规划
 - C. 确定里程碑事件的计划进度目标
 - D. 施工准备与资源配置计划
 - E. 总进度目标实现的条件和应采取的措施
8. 【2017-31】建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析；②进行项

目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（ ）。

- A. ②-①-③-⑤-④
B. ①-②-③-④-⑤
C. ③-②-④-①-⑤
D. ①-③-②-④-⑤

9. 【2017-35】关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务
B. 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性
C. 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度
D. 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划

10. 【2017-62】对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（ ）。

- A. 设计单位
B. 施工单位
C. 建设单位
D. 监理单位

11. 【2017-91】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。

- A. 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的
B. 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整
C. 供货方根据需要用和用途可编制不同深度的进度计划系统
D. 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划
E. 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同

12. 【2016-07】建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（ ）。

- A. ①→④→②→⑤→③
B. ②→①→⑤→③→④
C. ②→③→①→④→⑤
D. ①→③→④→②→⑤

13. 【2016-81】业主编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（ ）。

- A. 总进度计划
B. 控制性进度计划
C. 单项工程进度计划
D. 项目子系统进度计划
E. 年度进度计划

14. 【2015-30】设计进度计划主要是确定各设计阶段的（ ）。

- A. 专业协调计划
B. 设计工作量计划
C. 设计人员配置计划
D. 出图计划

15. 【2015-75】在项目实施阶段，项目总进度计划包括（ ）。

- A. 招标工作进度
B. 保修工作进度
C. 设计工作进度
D. 工程施工进度
E. 物资采购工作进度

16. 【2014-26】关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（ ）。

- A. 由多个相互独立的进度计划组成
B. 其建立是逐步完善的过程
C. 由项目各参与方共同参与编制
D. 一个特定项目的进度计划是唯一的



4. 【2018-17】编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。
- A. 合理安排施工企业计划周期内的生产活动
B. 具体指导建设工程施工
C. 确定项目实施计划周期内的资金需求
D. 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证
5. 【2018-87】关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。
- A. 建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排
B. 施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程
C. 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制
D. 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴
E. 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划
6. 【2017-78】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。
- A. 确定施工总进度目标
B. 确定里程碑事件的进度目标
C. 确定施工作业的具体安排
D. 确定一定周期内的人工需求
E. 确定一定周期内的资金需求
7. 【2016-75】关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（ ）。
- A. 可以论证项目进度目标
B. 可以确定施工作业的具体安排
C. 以控制性施工进度计划为依据编制
D. 可以确定里程碑事件的进度目标
E. 可以确定项目的年度资金需求
8. 【2015-47】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（ ）。
- A. 月度施工计划和旬施工作业计划
B. 季度施工计划和月度施工计划
C. 单位工程施工计划和月度施工计划
D. 季度施工计划和单位工程施工计划
9. 【2015-53】工程项目的施工总进度计划属于（ ）。
- A. 项目的施工总进度方案
B. 项目的指导性施工进度计划
C. 项目的控制性施工进度计划
D. 项目施工的年度施工计划
10. 【2015-80】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（ ）。
- A. 确定施工作业的具体安排
B. 确定计划期内的人、机、料需求
C. 确定控制性进度计划的关键指标
D. 确定里程碑计划节点
E. 确定计划期内的资金需求
11. 【2014-81】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。
- A. 确定一个月度的资源需求
B. 作为编制单体工程施工进度计划的依据
C. 论证施工总进度目标
D. 确定里程碑事件的进度目标
E. 确定施工作业的具体安排
12. 【2013-32】施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（ ）。
- A. 施工生产计划是施工进度计划的集合

- B. 属同一个计划系统，但范围不同
C. 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系
D. 属两个不同系统的计划，但两者紧密相关

13. 【2013-33】下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（ ）。

- A. 项目施工总进度计划
B. 项目施工年度计划
C. 项目月度施工计划
D. 企业旬施工生产计划

14. 【2013-81】按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为（ ）。

- A. 控制性进度计划
B. 指示性进度计划
C. 指导性进度计划
D. 实施性进度计划
E. 总结性进度计划

15. 【2020. 12-79】下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（ ）。

- A. 项目年度施工计划
B. 单体工程施工进度计划
C. 子项目施工进度计划
D. 施工总进度计划
E. 企业旬施工生产计划

16. 【2020. 12-65】编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。

- A. 对项目的结构进行逐层分解
B. 对项目施工进度控制进行管理职能分工
C. 确定单位时间内的人、材、机和资金需求
D. 论证施工总进度目标

2Z103030 施工进度计划的编制方法


1. 【2020-24】网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作分别最早在第8和第12天开始。该项工作的自由时差是（ ）天。

- A. 4
B. 2
C. 6
D. 8

2. 【2020-36】关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。

- A. 线路可依次用该线路上的节点代号来表示
B. 线路段是由多个箭线组成的通路
C. 线路中箭线的长度之和就是线路的长度
D. 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条

3. 【2020-52】某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（ ）。

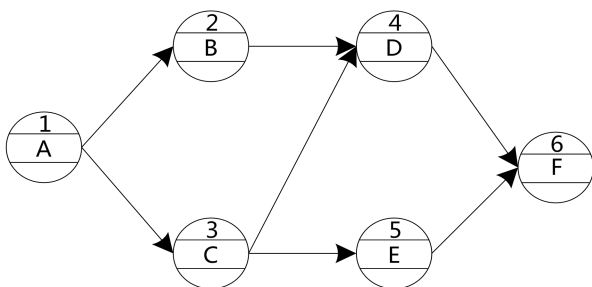


- A. E的紧前工作只有C
B. A完成后进行B、D
C. B的紧后工作是D、E
D. C的紧后工作只有E

4. 【2020-69】网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天。两项紧后工作的最迟开始时

间是第 9 和第 11 天。该项工作的最迟开始时间是第 () 天。


- A. 6
B. 8
C. 9
D. 7

5. 【2020-80】某双代号网络计划如下图，关键线路有 ()。

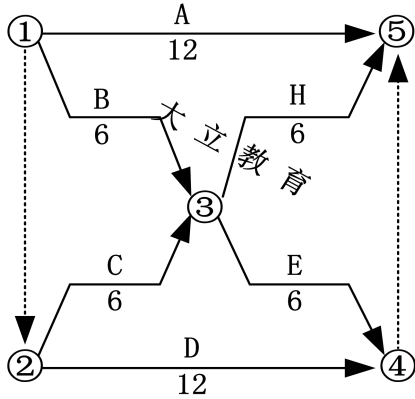


- A. ②-③-⑤
B. ①-③-④
C. ①-⑤
D. ①-③-⑤
E. ②-③-④

6. 【2019-12】如下所示网络图中，存在的绘图错误是 ()。




- A. 节点编号错误
B. 存在多余节点
C. 工作编号重复
D. 有多个终点节点

7. 【2019-16】某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，其计算工期是 () 天。

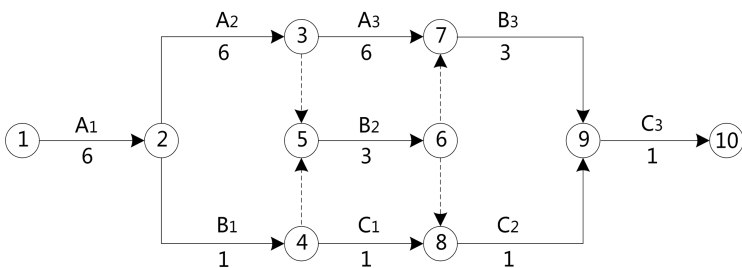

- A. 12
B. 22
C. 14
D. 17

8. 【2019-37】单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位:天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间、最早完成时间和总时差分别是 () 天。

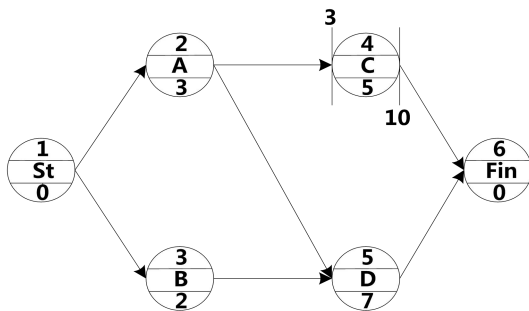

- A. 3、10、5 B. 5、8、2 C. 3、8、5 D. 5、10、2

9. 【2019-63】某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的间隔时间分别是4天和3天，则该工作的总时差是（ ）天。

- A. 7 B. 6 C. 8 D. 9

10. 【2019-75】网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。

- A. 最迟完成时间与最早完成时间的差
B. 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值
C. 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值
D. 与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值
E. 与所有紧后工作间间隔时间的最小值

11. 【2019-77】某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。

工作	A	B	C	D	E	G	H
紧前工作	-	A	A、B	A、C	C、D	A、E	E、G

- A. 工作B B. 工作C
C. 工作D D. 工作E
E. 工作G

12. 【2018-10】关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法正确的是（ ）。

- A. 既有内向箭线，又有外向箭线 B. 只有外向箭线，没有内向箭线
C. 只有内向箭线，没有外向箭线 D. 既无内向箭线，又无外向箭线

13. 【2018-11】用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。


- A. 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间
B. 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
C. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间
D. 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值

14. 【2018-22】单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（ ）。

- A. 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差
B. 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差
C. 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差

D. 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

15. 【2018-35】某建设工程网络计划如下图(时间单位:天), 工作C的自由时差是()天。

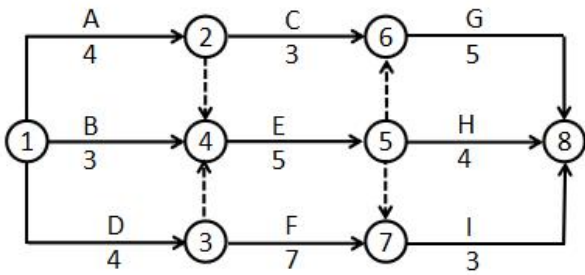

- A. 2 B. 0 C. 1 D. 3


16. 【2018-50】关于横道图进度计划的说法, 正确的是()。

- A. 横道图的一行只能表达一项工作 B. 工作的简要说明必须放在表头内
C. 横道图不能表达工作间的逻辑关系 D. 横道图的工作可按项目对象排序

17. 【2018-67】关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法, 正确的是()。

- A. 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值
B. 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值
C. 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间
D. 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间

18. 【2018-84】某建设工程网络计划如下图(时间单位:月), 该网络计划的关键线路有()。




- A. ①-②-⑤-⑦-⑩ B. ①-④-⑥-⑧-⑩
C. ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ D. ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E. ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩

19. 【2017-12】某双代号网络计划中, 工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天, 其持续时间为5天; 工作M有3项紧后工作, 它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天, 则工作M的自由时差为()天。

- A. 4 B. 1 C. 8 D. 11


20. 【2017-26】某双代号如下图(时间单位:天), 某关键线路有()条。



- A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

21. 【2017-59】根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。

工作名称	A	B	C	D	E	G	H
紧前工作	-	-	A	A	A、B	C	E



- A. 节点编号不对 B. 逻辑关系不对
C. 有多个终点节点 D. 有多个起点节点

22. 【2017-65】某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是第14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（ ）。

- A. 4天 B. 5天 C. 7天 D. 8天

23. 【2016-11】某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C、D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（ ）天。

- A. 5 B. 3 C. 8 D. 6


24. 【2016-25】关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。

- A. 各项工作必须按照时间先后进行排序 B. 不能将工作简要说明直接放在横道上
C. 可用于计算资源需要量 D. 尤其适用于较大的进度计划系统

25. 【2016-28】某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（ ）。

- A. 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行
B. 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天
C. 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天
D. 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天

26. 【2016-43】某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。

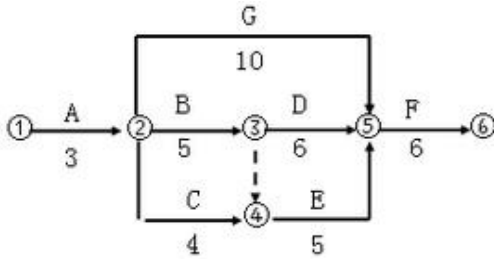


- A. ①→②→⑤→⑥
B. ①→②→③→⑤→⑥
C. ①→②→③→④→⑤→⑥
D. ①→②→④→⑤→⑥


27. 【2016-48】某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N，M、N工作的持续时间分别为4天、5天，M、N工作的最早开始时间分别为第9天、第11天，则工作Q的最早开始时间是第（ ）天。

- A. 9
B. 13
C. 15
D. 16

28. 【2016-67】某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则根据绘制的双代号网络图是（ ）。

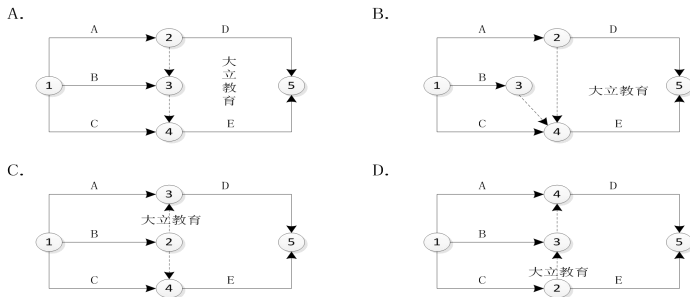


29. 【2016-91】某单代号网络计划如下图，其关键线路有（ ）。

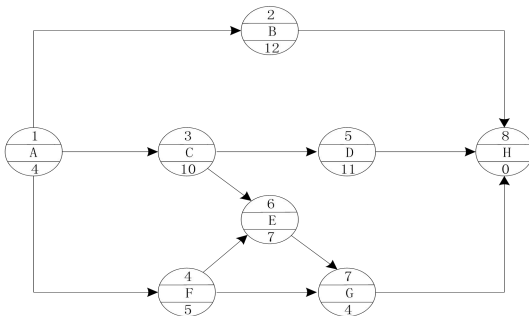


- A. ①→③→⑤→⑧
B. ①→②→⑧
C. ①→③→⑥→⑦→⑧
D. ①→④→⑦→⑧
E. ①→④→⑥→⑦→⑧

30. 【2015-19】根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中错误的有（ ）处。

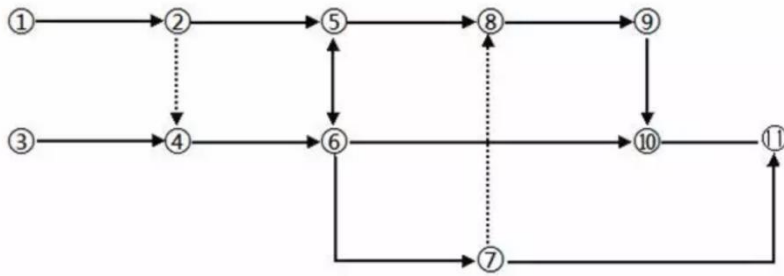


- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

31. 【2015-52】某单代号网络计划如下图所示(时间单位:天), 工作5的最迟完成时间是 ()。

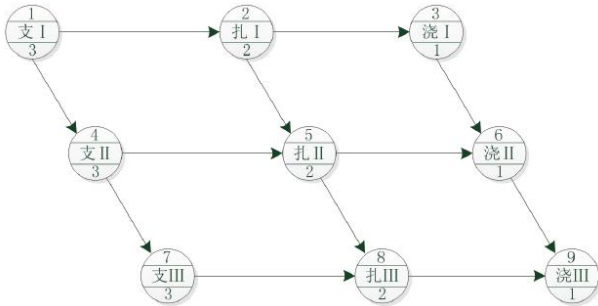


- A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

32. 【2015-61】某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天), 其关键线路有 () 条。

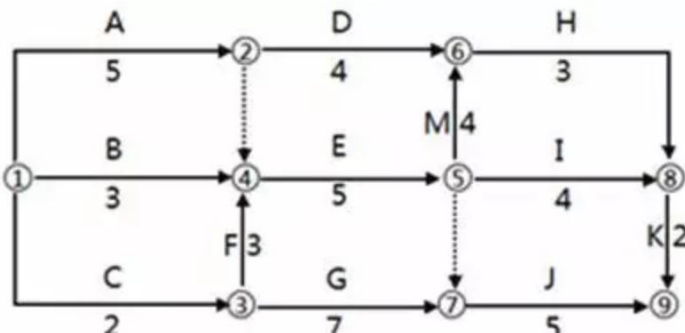


- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

33. 【2015-64】某单代号网络计划如下图所示(时间单位:天), 其计算工期是 () 天。

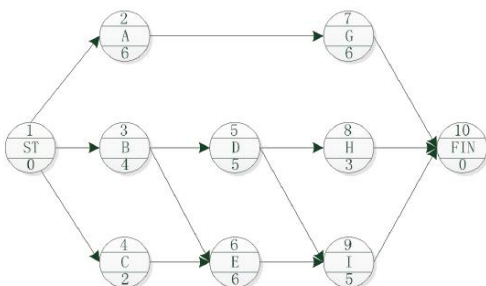

- A. 15 B. 12 C. 11 D. 10

34. 【2015-90】某钢筋混凝土基础工程, 包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序, 每道工序安排一个专业施工队进行, 分三段施工, 各工序在一个施工段上的作业时间分别3天、2天、1天, 关于其施工网络计划的说法, 正确的有 ()。



- A. 工作①—②是关键工作
B. 只有1条关键线路
C. 工作⑤—⑥是非关键工作
D. 节点⑤的最早时间是5
E. 虚工作③—⑤是多余的


35. 【2014-28】双代号网络计划中的关键线路是指（ ）。

- A. 总时差为零的线路
B. 总的工作持续时间最短的线路
C. 一经确定，不会发生转移的线路
D. 自始至终全部由关键工作组成的线路

36. 【2014-29】关于横道图进度计划表的说法，正确的是（ ）。


- A. 计划调整比较方便
B. 可以直观地确定计划的关键线路
C. 工作逻辑关系易于表达清楚
D. 可以将工作简要说明直接放到横道图上

37. 【2014-30】双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，其计算工期是（ ）天。

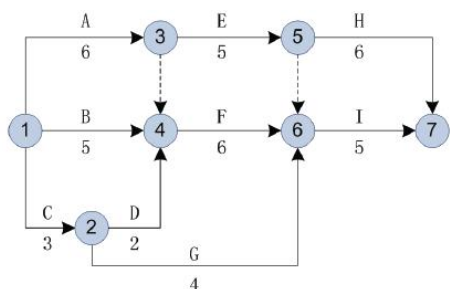


- A. 16
B. 17
C. 18
D. 20

38. 【2014-31】双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，其关键线路有（ ）条。

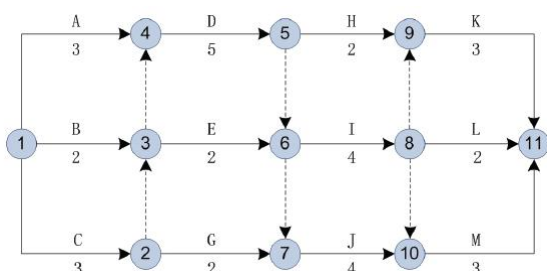

- A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

38. 【2014-32】单代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，工作C的最迟开始时间是（ ）。

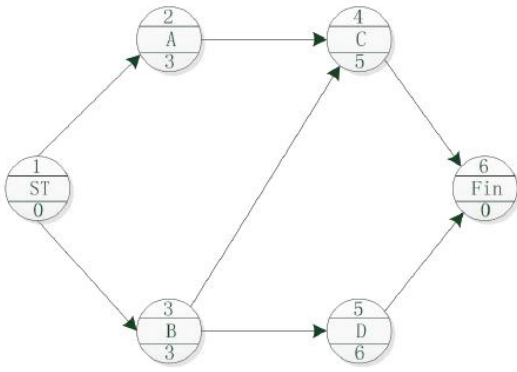


- A. 0 B. 1 C. 3 D. 4

39. 【2014-33】关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（ ）。

- A. 箭线不能交叉 B. 只有一个起点节点
C. 关键工作必须安排在图面中心 D. 工作箭线只能用水平线

40. 【2014-82】某分部工程的单代号网络计划如图所示(时间单位:天)，正确的有（ ）。

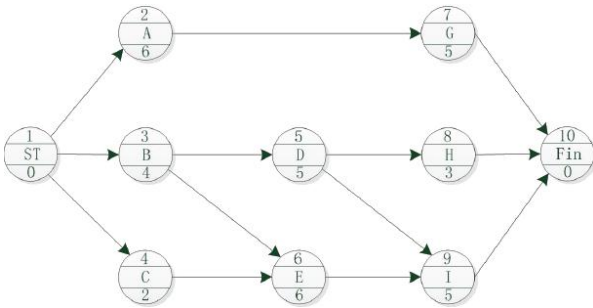


- A. 计算工期为15 B. 有两条关键线路
C. 工作H的自由时差为2 D. 工作G的总时差和自由时差均为4
E. 工作D和I之间的时间间隔为1

41. 【2013-34】双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。

- A. 箭线及其两端节点编号 B. 节点及其编号
C. 箭线及其起始节点标号 D. 箭线及其终点节点标号

42. 【2013-35】某工程的单代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，该计划的计算工期为（ ）天。

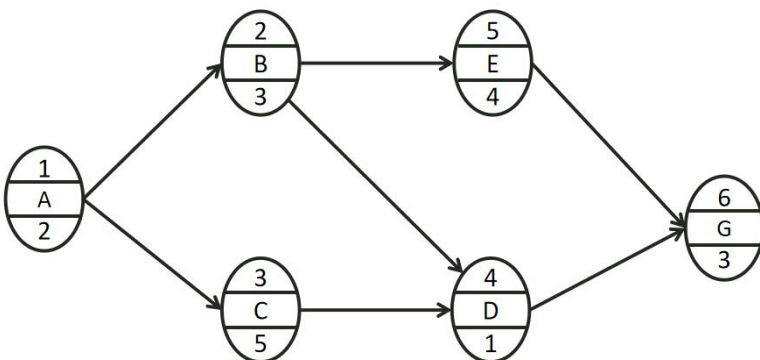


- A. 9 B. 11 C. 12 D. 15

43. 【2013-37】某工程网络计划中，工作N 最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后

工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为（ ）天。


- A. 2 B. 3 C. 7 D. 8

44. 【2013-38】某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，其关键线路有（ ）条。

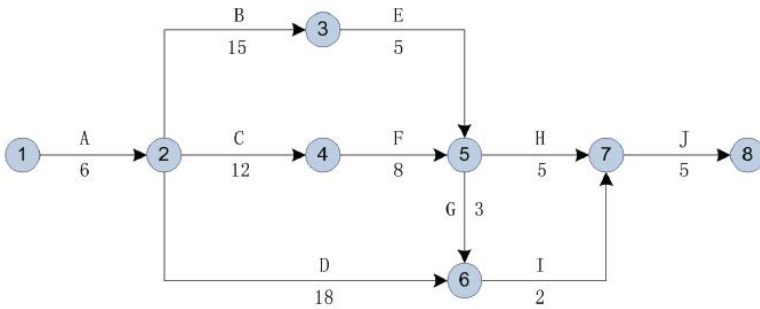

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

45. 【2013-82】某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（ ）。



- A. 循环回路 B. 多个终点节点
C. 多个起点节点 D. 节点编号重复
E. 两项工作有相同的节点编号

46. 【2013-83】关于网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。

- A. 单代号网络计划中由关键工作组成的线路
B. 总持续时间最长的线路
C. 时标网络计划中没有波形线的线路
D. 双代号网络计划中没有虚箭线的线路
E. 双代号网络计划中由关键节点连成的线路


47. 【2020. 12-51】某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（ ）。

序号	工作名称	持续时间	2020年03月												2020年04月									
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	1	3	5	7	9	11	13
1	构件预制	16天																						
2	构件吊装	4天																						
3	砌墙	10天																						
4	屋面基层	8天																						
5	屋面防水	4天																						

- A. 逻辑关系表达混乱
B. 工作持续时间和横道时间长度不一致
C. 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间

D. 横道上缺少工作的简要说明

48. 【2020. 12-50】双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（ ）。




A. 存在多个终点节点

B. 存在曲线形状的箭线

C. 出现循环回路

D. 存在多余的虚箭线

49. 【2020. 12-57】某项目双代号网络计划如下图(时间单位：天)，该网络计划的计算工期是（ ）天。

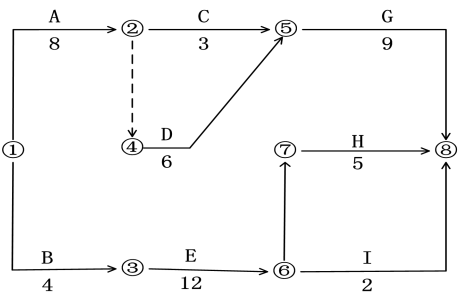

A. 23

B. 18

C. 20

D. 21

50. 【2020. 12-59】网络计划中，某工作最早第 3 天开始，工作持续 3 天，紧后工作的最迟开始时间是第 9 天，总时差是 2 天。则这两项工作的间隔时间是（ ）天。


A. 2

B. 1

C. 3

D. 5


51. 【2020. 12-94】根据《工程网络计划技术规程》，下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（ ）。



A.

B.

工作代号	工作名称	持续时间
ES_i	EF_i	TF_i
LS_i	LF_i	FF_i

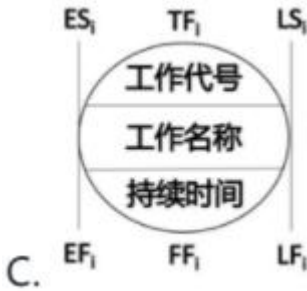

D.

工作代号	ES_i	LS_i
工作名称	TF_i	FF_i
持续时间	EF_i	LF_i

E.

工作代号	ES_i	EF_i
工作名称	LS_i	LF_i
持续时间	TF_i	FF_i

2Z103040 施工进度控制的任务和措施

- 【2020-13】下列施工进度控制措中，属于组织措施的是（ ）。
 - 编制进度控制的工作流程
 - 选择适合进度目标的合同结构
 - 编制资金使用计划
 - 编制和论证施工方案
- 【2020-54】下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。
 - 增加施工班组人数
 - 工程量的完成情况
 - 根据业主指令改变工程量
 - 根据现场条件改进施工工艺
- 【2019-67】根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划；②采取纠偏措施或调整计划；③分析计划执行的情况；④实施跟踪检查，收集实际进度数据。其正确的顺序是（ ）。
 - ④-②-③-①
 - ②-①-③-④
 - ③-①-④-②
 - ①-④-③-②
- 【2019-92】下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。
 - 评价项目进度管理的组织风险
 - 进行项目进度管理的职能分工
 - 学习进度控制的管理理念
 - 优化计划系统的体系结构
 - 规范进度变更的管理流程
- 【2018-08】建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。
 - 项目经理
 - 施工方案
 - 信息技术
 - 组织体系
- 【2018-16】下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。
 - 重视信息技术在进度控制中的应用
 - 分析工程设计变更的必要性和可能性
 - 采用网络计划方法编制进度计划
 - 编制与进度相适应的资源需求计划

7. 【2018-95】根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。
A. 进度计划实施过程中存在的问题分析
B. 进度执行情况对质量，安全和施工成本的影响
C. 进度的预测
D. 进度计划的完整性分析
E. 进度计划实施情况的综合描述
8. 【2017-06】项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（ ）。
A. 落实管理人员责任
B. 优化工程流程
C. 改进施工方法
D. 强化奖惩机制
9. 【2017-43】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（ ）措施。
A. 组织
B. 管理
C. 经济
D. 技术
10. 【2017-67】下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。
A. 优化工程施工方案
B. 应用 BIM 信息模型
C. 制定进度控制工作流程
D. 采用网络计划技术
11. 【2017-72】下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。
A. 构建施工监督控制的组织体系
B. 用工程网络计划技术进行进度管理
C. 选择合理的合同结构
D. 采取进度风险的管理措施
E. 编制与施工进度相适应的资源需求计划
12. 【2016-33】下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。
A. 应用工程网络技术编制进度计划
B. 重视信息技术的应用
C. 优选施工方案
D. 编制进度控制工作流程
13. 【2016-89】施工进度计划检查的内容包括（ ）。
A. 工程量的完成情况
B. 工作时间的执行情况
C. 实际进度与计划进度的偏差
D. 前一次检查提出问题的整改情况
E. 资源使用及进度保证的情况
13. 【2015-34】施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（ ）。
A. ①-②-③-④
B. ②-①-③-④
C. ②-①-④-③
D. ①-③-②-④
14. 【2015-66】下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。
A. 编制进度控制工作流程
B. 重视信息技术的应用
C. 优选施工方案
D. 进行进度控制的会议组织设计
15. 【2015-77】施工方进度计划的调整内容有（ ）。
A. 合同工期目标的调整
B. 工程量的调整

- C. 工作起止时间的调整
D. 工作关系的调整
E. 资源提供条件的调整
16. 【2014-34】施工进度计划调整的内容，不包括（ ）的调整。
A. 工作关系 B. 工程量 C. 工程质量 D. 资源提供条件
17. 【2014-35】下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。
A. 确定进度控制的工作流程 B. 优化施工方案
C. 选择合适的施工承发包方式 D. 选择合理的合同结构
18. 【2014-83】施工方进度控制工作的主要环节包括（ ）。
A. 确定施工项目的进度目标 B. 论证施工项目的进度目标
C. 编制施工进度计划及相关资源需求计划 D. 组织施工进度计划的实施
E. 施工进度计划的检查与调整
19. 【2013-39】下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。
A. 确定各类进度计划的审批程序 B. 优化项目的设计方案或施工方案
C. 选择合理的合同结构 D. 选择工程承发包方式
20. 【2020. 12-23】分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制环节的工作（ ）。
A. 优化物资需求计划 B. 编制施工进度计划
C. 组织施工进度计划实施 D. 施工进度计划调整
21. 【2020. 12-07】下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（ ）。
A. 检查工程量的完成情况 B. 编制进度管理报告
C. 编制劳动力需求计划 D. 沟通调整进度计划
22. 【2020. 12-86】下列施工进度控制措施中属于组织措施的有（ ）。
A. 组织进度计划的动态调整 B. 编制劳动力需求计划
C. 编制进度控制管理职能分工表 D. 进行进度控制会议组织设计
E. 选择合适的承发包模式

2Z104000 施工质量管理

2Z104010 施工质量管理与施工质量控制

1. 【2020-49】下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。
A. 施工现场平面布置和空间环境 B. 施工现场道路交通状况
C. 施工现场安全防护设施 D. 施工参建单位之间的协调
2. 【2020-58】下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（ ）。
A. 国家法律、法规的要求 B. 质量管理体系标准的要求
C. 施工质量验收标准的要求 D. 符合工程勘察、设计文件的要求
3. 【2020-91】关于施工质量控制责任的说法，正确的有（ ）。
A. 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收

- B. 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案
- C. 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任
- D. 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验
- E. 发生工程质量事故，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任
4. 【2019-24】为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对（ ）因素的控制。
- A. 材料 B. 机械 C. 方法 D. 环境
5. 【2019-31】下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是（ ）。
- A. 符合国家法律、法规的要求
- B. 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量
- C. 符合工程勘察、设计文件的要求
- D. 符合施工质量评定等级的要求
6. 【2019-95】下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。
- A. 施工单位的质量管理制度 B. 各参建单位之间的协调程度
- C. 管理者的质量意识 D. 运输设备的使用状况
- E. 施工现场的道路条件
7. 【2018-34】根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。
- A. 建筑工程实际使用年限 B. 建设单位要求年限
- C. 缺陷责任期 D. 建筑工程设计使用年限
8. 【2018-48】下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。
- A. 人 B. 机械 C. 材料 D. 环境
9. 【2018-82】根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。
- A. 终检局限性大 B. 控制的难度大
- C. 控制的成本高 D. 需要控制的因素多
- E. 过程控制要求高
10. 【2017-54】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（ ）。
- A. 需要控制的因素少，只有 4M1E 五大方面 B. 生产受业主监督，因此过程控制要求低
- C. 施工生产的流动性导致控制的难度大 D. 工程竣工验收是对施工质量的全面检查
11. 【2017-74】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。
- A. 计量器具 B. 建筑构配件
- C. 新型模板 D. 工程设备
- E. 安全防护设施
12. 【2016-12】影响施工质量五大要素是指人、材料、机械及（ ）。
- A. 方法与环境 B. 投资额与合同工期

- C. 方法与设计方案 D. 投资额与环境
13. 【2016-49】施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。
- A. 适用性、安全性、美观性、耐久性 B. 安全性、耐久性、美观性、可靠性
C. 适用性、安全性、耐久性、可靠性 D. 适用性、先进性、耐久性、可靠性
14. 【2016-86】施工质量控制的特点有（ ）。
- A. 结果控制要求高 B. 控制的难度大
C. 需要控制的因素多 D. 终检局限性大
E. 过程控制要求高
15. 【2015-21】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到
B. 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的
C. 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格
D. 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录
16. 【2015-46】在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（ ）的因素。
- A. 方法 B. 环境 C. 材料 D. 机械
17. 【2015-95】建筑工程施工质量控制难度大的原因有（ ）。
- A. 规范化的生产工艺 B. 成套的生产设备
C. 建筑产品的单件性 D. 施工生产的流动性
E. 复杂的工序关系
18. 【2014-36】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（ ）。
- A. 解体检查内在质量 B. 建立固定的生产流水线
C. 加强观感质量验收 D. 加强对施工过程的质量检查
19. 【2014-37】在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（ ）。
- A. 执业资格注册制度 B. 见证取样制度
C. 专项施工方案论证制度 D. 建设工程质量监督管理制度
20. 【2014-84】与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有（ ）。
- A. 需要控制的因素多 B. 控制的难度大
C. 过程控制的要求高 D. 控制的标准化程度高
E. “终检”的全面性强
21. 【2013-40】关于施工质量控制的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工质量控制应独立于施工质量管理
B. 施工质量控制的关键在于工程项目的终检
C. 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
D. 施工质量控制应强调过程控制



A. 自然环境因素 B. 作业环境因素
C. 施工质量管理环境因素 D. 技术环境因素

A. 建设单位
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 施工图审查单位

A. 施工现场的照明情况
B. 施工单位的质量管理制度
C. 施工现场的道路条件
D. 各参建单位之间的协调程度
E. 施工单位的质量管理体系

A. 项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体
B. 项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字
C. 项目经理负责组织编制施工组织设计
D. 项目经理可以委派专职质量管理人员代替自己参加工程竣工验收

A. 质量目标、质量手册、质量计划和质量记录
B. 质量手册、程序文件、质量计划和质量记录
C. 质量方针、质量手册、程序文件和质量记录
D. 质量手册、质量计划、质量记录和质量评审

A. 确定项目施工应达到的质量标准
B. 纠正计划执行中的质量偏差
C. 按质量计划开展施工技术活动
D. 检查施工质量是否达到标准

A. 企业最高管理者
B. 政府相关主管部门
C. 公正的第三方认证机构
D. 企业所属的行业协会

A. 过程方法
B. 循证决策
C. 以内控体系为关注焦点
D. 全员积极参与

A. 质量计划 B. 质量手册 C. 质量记录 D. 程序文件



- 53

- 54

27. 【2020. 12-14】下列项目施工质量成本中, 属于外部质量保证成本的是 ()。

- A. 从业人员劳动技能培训费
- B. 不合格检验批返工重做费
- C. 计量器具标定检验费
- D. 混凝土强度见证检测费

28. 【2020. 12-95】下列施工质量工作保证措施中, 属于施工准备阶段应落实的有 ()。

- A. 实行自检、互检和专检, 强化过程控制
- B. 建立工程测量控制网和测量控制制度
- C. 进行施工平面设计, 建立施工现场管理制度
- D. 进行技术交底和技术培训工作, 制定技术管理制度
- E. 严格按规范进行施工, 认真执行质量检查制

29. 【2020. 12-27】关于企业质量管理体系认证与监督的说法, 正确的是 ()。

- A. 企业获准认证的有效期为四年
- B. 质量管理体系由相关政府主管部门认证
- C. 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理
- D. 质量管理体系认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行

2Z104030 施工质量控制的内容和方法

1. 【2020-28】下列施工场质量检查项目中, 适宜采用试验法的是 ()。

- A. 钢的力学性能检验
- B. 混凝土坍落度的检测
- C. 砌体的垂直度检查
- D. 沥青拌合料的温度检测

2. 【2020-33】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》, 对施工单位采取相应措施清除一般项目缺陷后的检验批验收, 应采取的做法是 ()。

- A. 经原设计单位复核后予以验收
- B. 经检测单位鉴定后予以验收
- C. 按验收程序重新组织验收
- D. 按技术处理方案和协商文件进行验收

3. 【2020-50】混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的 ()。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 90%

4. 【2019-19】建设工程施工质量验收时, 分部工程的划分一般按 () 确定。

- A. 施工工艺、设备类别
- B. 专业性质、工程部位
- C. 专业类别、工程规模
- D. 材料种类、施工程序

5. 【2019-36】下列质量控制活动中, 属于事中质量控制的是 ()。

- A. 设置质量控制点
- B. 明确质量责任
- C. 评价质量活动结果
- D. 约束质量活动行为

6. 【2019-59】为了保证工程质量, 对重要建材的使用, 必须经过 ()。

- A. 监理工程师签字、项目经理签准
- B. 总监理工程师签字
- C. 业主现场代表签准
- D. 业主现场代表签字、监理工程师签准

7. 【2018-39】建设工程施工过程中对分项分部质量验收时, 应该给出综合质量评价的检查项目是 ()。

- A. 分项工程质量验收
B. 质量控制资料验收
C. 主体结构功能检测
D. 观感质量验收
8. 【2018-42】在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。
A. 主控项目和一般项目的检验结果
B. 主控项目的检验结果
C. 资料检查完整、合格和主控项目检验结果
D. 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果
9. 【2018-46】施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。
A. 施工项目经理
B. 总监理工程师
C. 甲方工程师
D. 项目技术负责人
10. 【2017-16】项目开工前，项目技术负责人应向（ ）进行书面技术交底。
A. 项目经理
B. 承担施工的责任人
C. 施工班组长
D. 操作工人
11. 【2017-61】下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（ ）。
A. 设置质量控制点
B. 复核原始坐标
C. 规划施工场地
D. 布置施工机械
12. 【2016-52】施工过程中，施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。
A. 项目经理
B. 监理工程师
C. 建设单位项目负责人
D. 项目技术负责人
13. 【2016-55】项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准实施。
A. 项目经理
B. 总监理工程师
C. 项目技术负责人
D. 专业监理工程师
14. 【2015-50】下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（ ）。
A. 水泥的安定性
B. 预应力钢筋的张拉
C. 砌体的砂浆饱满度
D. 混凝土浇筑后的拆模时间
15. 【2015-55】下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（ ）。
A. 利用全站仪复查轴线偏差
B. 利用酚酞液观察混凝土表面碳化
C. 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷
D. 利用小锤检查面砖铺贴质量
16. 【2015-65】下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（ ）。
A. 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施
B. 隐蔽工程的检查
C. 工程质量事故的处理
D. 进场材料抽样检验或试验
17. 【2014-41】施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（ ）。
A. 靠
B. 量
C. 吊
D. 套



- 58

- C. 负责人放松质量标准造成的质量事故 D. 负责人追求施工进度造成的质量事故
- E. 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故
12. 【2016-10】工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。
- A. 限制使用 B. 报废处理 C. 加固处理 D. 不做处理
13. 【2016-17】某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成 11 名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（ ）。
- A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故
14. 【2016-32】由于工程负责人不按规范指导施工、随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。
- A. 指导责任事故 B. 操作责任事故
- C. 技术责任事故 D. 自然灾害事故
15. 【2016-79】下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。
- A. 施工方法选用不当 B. 盲目追求利润不顾质量
- C. 质量控制不严格 D. 特大暴雨导致质量不合格
- E. 检验制度不严密
16. 【2015-15】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（ ）事故。
- A. 操作责任 B. 社会责任 C. 自然灾害 D. 指导责任
17. 【2015-17】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（ ）。
- A. 制定事故处理方案 B. 事故的责任处罚
- C. 事故处理的鉴定验收 D. 提交处理报告
18. 【2015-81】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（ ）。
- A. 使用不合格的工程材料 B. 施工人员不具备上岗的技术资质
- C. 边勘察、边设计、边施工 D. 勘察报告不准、不细
- E. 施工管理混乱
19. 【2014-45】某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致 2 人死亡，1 人重伤，直接经济损失 300 万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111 号），该事故等级为（ ）。
- A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故
20. 【2014-46】根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（ ）。
- A. 采用不适宜施工方法引发的质量事故 B. 材料检验不严引发的质量事故
- C. 盲目追求利润引发的质量事故 D. 对地质情况估计错误引发的质量事故
21. 【2014-86】根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知》（建质[2010]，111 号）的规定，质量事故处理报告的内容有（ ）。

- A. 对事故处理的建议
B. 事故原因分析及论证
C. 事故发生后的应急防护措施
D. 事故调查的原始资料
E. 检查验收记录

22. 【2013-49】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致 28d 的混凝土实际强度达不到设计规定强度的 30%，对这起质量事故的正确处理方法是（ ）。

- A. 修补处理 B. 加固处理 C. 返工处理 D. 不做处理

23. 【2013-86】施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（ ）。

- A. 事故调查
B. 事故的技术处理
B. 制订事故处理方案
D. 事故的责任处罚
E. 事故处理鉴定验收

24. 【2020. 12-55】施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误并由此引发质量事故，按生产原因分类该事故属于（ ）引发的质量事故。

- A. 技术原因 B. 管理原因
C. 社会原因 D. 经济原因

25. 【2020. 12-38】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。

- A. 10 人死亡，直接经济损失 1000 万元的事故
B. 3 人死亡 10 人重伤，直接经济损失 2000 万元的事故
C. 30 人死亡，直接经济损失 6000 万元的事故
D. 100 人重伤，直接经济损失 1.2 亿元的事故

26. 【2020. 12-74】按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。

- A. 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故
B. 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故
C. 施工人员在浇筑混凝土时随意加水造成质量事故
D. 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故
E. 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故

27. 【2020. 12-04】根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由（ ）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。

- A. 施工单位负责人 B. 建设单位负责人
C. 监理单位负责人 D. 设计单位负责人

2Z104050 施工质量的政府监督

1. 【2020-11】关于工程质量监督的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工单位在项目开工前向监督机构申请质量监督手续
B. 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为
C. 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性 or 临时性建筑工程
D. 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督

2. 【2020-17】政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（ ）。
- A. 签发工程竣工验收意见
B. 对工程实体质量进行检查验收
C. 检查核有关工程质量的文件和资料
D. 对验收的组织形式、程序等进行监督
3. 【2020-81】建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（ ）。
- A. 抽查质量检测单位的工程质量行为
B. 抽查工程质量责任主体的工程质量行为
C. 参与工程质量事故的调查处理
D. 监督工程竣工验收
E. 审核工程建设标准的完整性
4. 【2019-08】工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。
- A. 7 天
B. 10 天
C. 1 月
D. 3 天
5. 【2019-29】政府对工程质量监督的行为从性质上属于（ ）。
- A. 技术服务
B. 委托代理
C. 行政执法
D. 司法审查
6. 【2019-74】建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。
- A. 抽查质量检测单位的工程质量行为
B. 抽查工程质量责任主体的工程质量行为
C. 审核工程建设标准的完整性
D. 参与工程质量事故的调查处理
E. 监督工程竣工验收
7. 【2018-61】政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。
- A. 施工过程
B. 竣工验收阶段
C. 项目开工前
D. 建立档案阶段
8. 【2018-65】建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）。
- A. 每周一次
B. 每旬一次
C. 每月一次
D. 每季度一次
9. 【2018-78】某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（ ）。
- A. 检查参与工程建设各方的组织机构
B. 检查参与工程建设各方的质量行为
C. 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况
D. 审查参与工程建设各方人员资格证书
E. 监督基础分部工程验收
10. 【2017-21】关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（ ）。
- A. 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书
B. 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督
C. 政府质量监督属于行政调解行为
D. 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施
11. 【2017-23】工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。
- A. 施工许可证
B. 质量监督报告

- C. 质量监督文件 D. 第一次监督记录
12. 【2017-79】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。
- A. 进入被检查单位的施工现场进行检查 B. 要求被检查单位提供相关工程财务台账
- C. 发现有影响工程质量问题时，责令改正 D. 降低企业资质等级
- E. 吊销企业营业执照
13. 【2016-45】政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（ ）。
- A. 全部暂停施工指令单 B. 临时收缴资质证书通知单
- C. 吊销资质证书通知单 D. 质量问题整改通知单
14. 【2016-68】在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（ ）。
- A. 屋面防水工程 B. 外装修工程
- C. 基础工程 D. 室内管网工程
15. 【2016-73】政府质量监督管理的内容有（ ）。
- A. 抽查主要建筑材料的质量 B. 依法处罚违法违规行为
- C. 监督工程竣工验收 D. 定期统计分析本地区质量情况
- E. 抽查施工进度计划的执行情况
16. 【2015-45】根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（ ）天。
- A. 14 B. 7 C. 5 D. 3
17. 【2015-88】下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（ ）。
- A. 勘察单位 B. 设计单位 C. 施工单位 D. 检测单位 E. 监理单位
18. 【2014-47】政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（ ）。
- A. 各参与方主体的质量行为 B. 建设工程的招标结果
- C. 工程建设的地址 D. 建设工程的实体质量
19. 【2014-48】分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（ ）报送质量监督机构备案。
- A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工单位 D. 设计单位
20. 【2014-87】政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（ ）阶段应每月安排监督检查。
- A. 施工准备 B. 基础施工
- C. 主体结构施工 D. 设备安装
- E. 竣工验收
21. 【2013-50】工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是（ ）。
- A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

22. 【2020. 12-58】建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（ ）行为。
- A. 技术服务
B. 行政执法
C. 业务指导
D. 行业监管
23. 【2020. 12-53】工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（ ）。
- A. 施工现场准备工作情况
B. 主要建筑材料、建筑构配件的质量
C. 参与工程建设各方主体的质量行为
D. 施工现场计量器具检验情况
24. 【2020. 12-88】建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（ ）。
- A. 检查参与工程建设各方的质量行为
B. 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况
C. 审查基础工程施工方案
D. 监督基础分部工程的验收
E. 审查参与工程建设各方人员资格证书

2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

1. 【2020-20】根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（ ）。
- A. 组织的全体职工
B. 影响人类生存的各种自然因素
C. 组织的管理团队
D. 静态组织结构
2. 【2020-40】施工企业职业健康安全管理体系的运行中，管理评审应由（ ）承担。
- A. 施工企业的最高管理者
B. 项目经理
C. 项目技术负责人
D. 施工企业安全负责人
3. 【2020-71】《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ）。
- A. 总则
B. 环境目标
C. 环境因素
D. 合规义务
E. 措施的策划
4. 【2019-46】下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中，属于管理体系运行的是（ ）。
- A. 管理评审
B. 内部审核
C. 合规性评价
D. 文件管理
5. 【2019-64】工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制技术措施计划；⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是（ ）。
- A. ②-①-④-⑤-③
B. ①-②-④-⑤-③
C. ①-②-⑤-④-③
D. ②-①-④-③-⑤
6. 【2019-91】职业健康安全管理体系文件包括（ ）。
- A. 管理手册
B. 程序文件
C. 管理方案
D. 作业文件
E. 初始状态评审文件

7. 【2018-13】根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA 循环中“A”环节指的是（ ）。
- A. 策划 B. 支持和运行 C. 改进 D. 绩效评价
8. 【2018-25】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。
- A. 管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制
- B. 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价
- C. 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
- D. 管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价
9. 【2018-80】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的有关要求有（ ）。
- A. 设计单位的生产安全事故处理提出指导意见
- B. 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
- C. 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
- D. 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
- E. 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
10. 【2017-22】职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。
- A. 最高管理者 B. 项目经理 C. 技术负责人 D. 专职安全员
11. 【2017-82】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》(GB/T28000)标准，建设工程对施工职业健康安全管理的有关要求包括（ ）。
- A. 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划
- B. 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划
- C. 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任
- D. 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- E. 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
12. 【2016-40】施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。
- A. 管理体系接受政府监督的一种体制 B. 管理体系自我保证和自我监督的一种机制
- C. 企业最高管理者对管理体系的系统评价 D. 对企业执行相关法律情况的评价
13. 【2016-42】关于施工企业职业健康安全和环境管理要求的说法，正确的是（ ）。
- A. 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构
- B. 企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人
- C. 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权力和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任
- D. 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用
14. 【2016-74】职业健康安全和环境管理体系的作业文件一般包括（ ）。
- A. 作业指导书 B. 管理规定
- C. 监测活动准则 D. 程序文件引用表格

E. 绩效报告

15. 【2015-28】施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（ ）对管理体系进行系统评价。

- A. 施工企业技术负责人
B. 施工企业安全部门负责人
C. 项目经理
D. 施工企业的最高管理者

16. 【2015-58】施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（ ）。

- A. 作业文件
B. 管理手册
C. 程序文件
D. 监测活动准则

17. 【2015-84】施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（ ）。

- A. 监测活动准则
B. 管理手册
C. 程序文件
D. 操作规程
E. 管理规定

18. 【2014-49】“及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全体系运行中的（ ）活动。

- A. 信息交流
B. 执行控制程序
C. 预防措施
D. 文件管理

19. 【2014-88】根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（ ）。

- A. 应采取生态保护措施
B. 建筑材料和装修必须符合国家标准
C. 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用
D. 经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术
E. 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响

20. 【2013-56】施工企业实施环境管理体系标准的关键是（ ）。

- A. 采用 PDCA 循环管理模式
B. 坚持持续改进和环境污染预防
C. 组织最高管理者的承诺
D. 组织全体员工的参与

21. 【2020. 12-15】职业健康安全管理的目的通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的（ ），避免事故发生。

- A. 违章指挥和违规作业
B. 不安全行为和状态
C. 不安全状态和职业病
D. 违章作业和错误操作

22. 【2020. 12-72】下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（ ）。

- A. 现场应配备紧急处理医疗设施
B. 应减少施工噪音对周围生活环境的影响
C. 禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料
D. 现场应采取防暑、降温措施
E. 现场生产区、生活区、办公区应分离

23. 【2020. 12-37】施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（ ）进行。

- A. 施工企业行业协会
B. 施工企业上级主管部门
C. 施工企业的最高管理者
D. 第三方认证机构

1. 【2020-29】施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（ ）年。
- A. 1
B. 2
C. 5
D. 3
2. 【2020-37】下列施工现场危源中，属于第一类危险源的是（ ）。
- A. 工人焊接操作不规范
B. 油漆存放没有相应的防护设施
C. 现场存在大量油漆
D. 焊接设备缺乏维护保养
3. 【2020-70】对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。
- A. 单项隐患综合处理
B. 冗余安全度处理
C. 预防与减灾并重处理
D. 直接隐患与间接隐患并治
4. 【2020-73】对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。
- A. 特种作业操作证每 5 年复审一次
B. 上岗作业前必须进行专业的安全技术培训
C. 培训考核合格取得操作证后才可独立作业
D. 培训和考核的重点是安全技术基础知识
E. 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至 6 年一次
5. 【2019-18】下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是（ ）。
- A. 工伤保险
B. 基本医疗保险
C. 意外伤害保险
D. 失业保险
6. 【2019-34】下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是（ ）。
- A. 消除或减少故障
B. 隔离危险物质
C. 增加安全系数
D. 设置安全监控系统
7. 【2019-49】根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为（ ）年一次。
- A. 1
B. 3
C. 6
D. 10
8. 【2019-89】根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。
- A. 深基坑工程
B. 起重吊装工程
C. 拆除工程
D. 地下暗挖工程
E. 高大模板工程
9. 【2018-30】下列风险控制方法中，适用于第一风险范围控制的是（ ）。
- A. 提高各类施工设施的可能性
B. 隔离危险物质
C. 设置安全监控系统
D. 改善作业环境

10. 【2018-52】某建设工程施工现场发生触电事故后，项目组对工人进行安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工现场安全隐患处理原则中的（ ）。
- A. 直接隐患和间接隐患相结合
B. 预防和减灾并重处理原则
C. 动态处理原则
D. 单项隐患综合处理原则
11. 【2018-91】下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。
- A. 事故现场会
B. 岗前三级教育
C. 变换岗位时的安全教育
D. 安全生产会议
E. 安全活动日
12. 【2017-47】根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。
- A. 40
B. 30
C. 50
D. 60
13. 【2017-49】施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（ ）。
- A. 人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理
B. 在处理安全隐患时应设置多道防线
C. 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施
D. 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备
14. 【2017-52】项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（ ）。
- A. 加强员工的安全意识培训和教育
B. 改善施工作业环境
C. 建立安全生产监控体系
D. 制定应急救援体系
15. 【2017-85】根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ）。
- A. 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查
B. 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果
C. 专项施工方案有专职安全生产管理人员进行现场监督
D. 专项施工方案经现场工程师签字后即可实施
E. 专项施工方案应由企业法定代表人审批
16. 【2016-20】某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。
- A. 直接隐患与间接隐患并治
B. 单项隐患综合处理
C. 冗余安全处理
D. 预防与减灾并重处理
17. 【2016-61】根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。
- A. 项目经理
B. 总监理工程师
C. 项目技术负责人
D. 建设单位项目负责人
18. 【2016-85】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对施工方案进行论证、审查

的分部分项工程有（ ）。

- A. 拆除工程
- B. 地下暗挖工程
- C. 高大模板工程
- D. 起重吊装工程
- E. 深基坑工程

19. 【2015-48】根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（ ）。

- A. 基本医疗保险
- B. 工伤保险
- C. 意外伤害保险
- D. 失业保险

20. 【2015-54】下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（ ）。

- A. 提高各类设施的可靠性
- B. 设置安全监控系统
- C. 隔离危险物质
- D. 加强员工的安全意识教育

21. 【2015-91】项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（ ）。

- A. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针
- B. 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度
- C. 必须符合有关法律、法规及规程的要求
- D. 必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制
- E. 遵循安全生产投入最小

22. 【2014-50】关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。

- A. 年满 16 周岁，且不超过国家法定退休年龄
- B. 具有初中及以上文化程度
- C. 必须为男性
- D. 连续从事本工种 10 年以上

23. 【2014-51】施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（ ）原则的体现。

- A. 重点处理
- B. 动态处理
- C. 预防与减灾并重
- D. 冗余安全度处理

24. 【2014-52】对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（ ）负责实施。

- A. 公司、项目、班组
- B. 企业、工区、施工队
- C. 企业、公司、工程处
- D. 工区、施工队、班组

25. 【2014-53】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（ ）的落实。

- A. 安全责任制
- B. 施工起重机械的使用登记制度
- C. 现场人员的安全教育制度
- D. 专项施工方案专家论证制度

26. 【2014-71】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（ ）。

- A. 开挖深度超过 5m 的基坑支护工程
- B. 预应力结构张拉工程
- C. 高大模板工程
- D. 悬挑脚手架工程
- E. 大体积混凝土工程

27. 【2014-89】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的是（ ）。

- A. 应当具备初中及以上文化程度
- B. 取得操作证后准许独立作业
- C. 技能熟练后操作证可以不复审
- D. 年满 18 周岁，且不超过国家法定退休年龄
- E. 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格

28. 【2020.12-49】施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（ ）。

- A. 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门
B. 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人
C. 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员横向涵盖各职能部门
D. 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员横向涵盖各项目负责人
29. 【2020. 12-02】关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。
- A. 具有初中及以上文化程度
B. 必须为男性
C. 连续从事特种工作 10 年以上
D. 年满 16 周岁且不超过国家法定退休年龄
30. 【2020. 12-80】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（ ）。
- A. 拆除工程
B. 深基坑工程
C. 地下暗挖工程
D. 起重吊装工程
E. 高大模板工程
31. 【2020. 12-45】下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。
- A. 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施
B. 工人取用汽油操作不规范
C. 汽油储存设备老化
D. 现场存放大量汽油

2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理

1. 【2020-63】施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（ ）次。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. 【2020-68】施工生产安全事故应急预案体系由（ ）构成。
- A. 综合应急预案，单项应急预案、重点应急预案
B. 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案
C. 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案
D. 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
3. 【2020-83】施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（ ）。
- A. 事故发生单位概况
B. 对事故责任者处理决定
C. 事故发生的原因和事故性质
D. 事故责任的认定
E. 事故发生的经过和救援情况
4. 【2019-60】根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于（ ）。
- A. 专项施工方案
B. 专项应急预案
C. 现场处置预案
D. 危大工程预案
5. 【2019-94】关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（ ）。
- A. 事故原因未查清不放过
B. 事故责任人员未受到处理不放过
C. 防范措施没有落实不放过
D. 职工群众未受到教育不放过
E. 事故未及时报告不放过
6. 【2018-28】某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应

急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。

- A. 专项应急预案
- B. 综合应急预案
- C. 现场应急预案
- D. 现场处置方案

7. 【2018-43】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。

- A. 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失 5000 万元，没有人员伤亡
- B. 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失 1000 万元，45 人重伤
- C. 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失 960 万元，8 人重伤
- D. 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成 35 人死亡，直接经济损失 4500 万元

8. 【2018-90】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入

- A. 不立即组织事故抢救
- B. 伪造或者故意破坏事故现场
- C. 在事故调查处理期间擅离职守
- D. 谎报或者瞒报事故
- E. 迟报或者漏报事故

9. 【2017-46】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成 74 人死亡，2 人受伤的事故，该事故属于（ ）事故。

- A. 中大
- B. 较大
- C. 一般
- D. 特别重大

10. 【2017-66】根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 2

11. 【2017-87】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故单位处 100 万元以上 500 万元以下罚款的情形有（ ）。

- A. 谎报或者瞒报事故
- B. 迟报或者漏报事故
- C. 伪造事故现场
- D. 事故发生后逃匿
- E. 在事故调查处理期间擅离职守

12. 【2016-41】某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。

- A. 综合应急预案
- B. 现场处置预案
- C. 专项应急预案
- D. 现场应急预案

13. 【2015-40】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（ ）。

- A. 迟报或漏报事故
- B. 销毁有关证据
- C. 拒绝落实对事故责任人的处理意见
- D. 指使他人作伪证

14. 【2015-76】生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下罚款的情形有（ ）。

- A. 不立即组织事故抢救
- B. 销毁有关证据
- C. 迟报或漏报事故
- D. 指使他人作伪证

E. 故意破坏事故现场

15. 【2014-55】生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（ ）。

- A. 只编写综合应急预案
B. 只编写现场处置方案
C. 将综合应急预案与专项应急预案合并编写
D. 将专项应急方案与现场处置方案合并编写

16. 【2014-90】编制生产安全事故应急预案的目的有（ ）。

- A. 避免紧急情况发生时出现混乱
B. 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求
C. 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施
D. 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响
E. 确保建设主管部门尽快开展调查处理

17. 【2013-57】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)，生产安全事故发生后，受伤者或是最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向（ ）报告。

- A. 项目经理
B. 安全员
C. 施工单位负责人
D. 项目总监理工程师

18. 【2013-89】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入 40%~80% 罚款的情形有（ ）。

- A. 不立即组织事故抢救
B. 谎报或瞒报事故
C. 迟报或者漏报事故
D. 在事故调查处理期间擅离职守
E. 伪造或者故意破坏事故现场

19. 【2020. 12-21】施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（ ）向本单位从业人员公布。

- A. 施工单位所在地应急管理部门
B. 施工单位主要负责人
C. 施工单位法定代表人
D. 施工单位生产安全管理部门负责人

20. 【2020. 12-89】施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（ ）。

- A. 项目建设单位的组织机构发生调整
B. 应急指挥机构及其职责发生调整
C. 面临的事故风险发生重大变化
D. 上位预案中有关规定发生重大变化
E. 重要应急救援资源发生重大变化

2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求

1. 【2020-34】下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（ ）。

- A. 在施工现场围挡内焚烧沥青
B. 将有害废弃物体深层土方回填
C. 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施
D. 使用密封的圆筒处理高空废弃物

2. 【2020-53】下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（ ）。

- A. 现场按规定设置标志牌
B. 结构外脚手架设置安全网
C. 建立各级文明施工岗位责任制
D. 工地设置符合规定的围挡

3. 【2019-50】施工现场文明施工管理的第一责任人是（ ）。

- A. 建设单位负责人
B. 施工单位负责人



- C. 项目专职安全员 D. 项目经理

4. 【2019-52】下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是（ ）。

A. 工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施
B. 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填
C. 易扬尘处采用密目式安全网封闭
D. 机械设备安装消声器

5. 【2018-44】关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。

A. 施工现场要设置半封闭的围挡 B. 施工现场设置的围挡高度不得低于 1.5m
C. 施工现场主要场地应硬化 D. 专职安全员为现场文明施工的第一责任人

6. 【2018-56】关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。

A. 存放化学溶剂的库房地面和高 250mm 墙面必须进行防渗处理
B. 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识
C. 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网
D. 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

7. 【2018-62】根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其“一图”是指（ ）。

A. 施工进度横道图 B. 大型机械布置位置图
C. 施工现场交通组织图 D. 施工现场平面布置图

8. 【2017-38】施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。

A. 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
B. 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
C. 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
D. 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌

9. 【2017-41】下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（ ）。

A. 将未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施
B. 在大门口铺设一定距离的石子路
C. 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡
D. 将有害废弃物用作深层土回填

10. 【2017-45】某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是（ ）。

A. 入库密闭存放或覆盖存放 B. 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草
C. 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 D. 安装除尘器

11. 【2016-38】关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。

A. 施工现场主要场地应硬化
B. 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于 1.5 m²
C. 沿工地四周连续设置高度不低于 1.5m 的围挡

D. 施工现场要实行半封闭式管理

12. 【2016-39】根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。

- A. 施工进度网络图
- B. 安全管理流程图
- C. 大型施工机械布置图
- D. 施工现场平面布置图

13. 【2015-20】根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（ ）。

- A. 将有害废弃物用作土方回填
- B. 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施
- C. 使用密封式圈筒处理高空废弃物
- D. 在现场露天焚烧油毡

14. 【2015-26】下列施工现场文明施工措施中，正确的是（ ）。

- A. 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
- B. 市区主要路段设置围挡的高度不低于 2m
- C. 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人
- D. 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运

15. 【2015-43】下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（ ）。

- A. 固体废弃物必须单独储存
- B. 电气焊必须在工作面设置光屏障
- C. 存放油料库的地面和高 250mm 墙面必须进行防渗处理
- D. 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚 12:00 至次日早 6:00 时段

16. 【2014-56】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（ ）。

- A. 集体宿舍与作业区隔离
- B. 工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙
- C. 食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器
- D. 施工现场不允许有积水存在

17. 【2014-57】下列施工现场超噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（ ）。

- A. 用电动空压机代替柴油机
- B. 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器
- C. 在工厂车间生产制作门窗
- D. 装卸材料轻拿轻放

18. 【2013-58】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，推土机在夜间施工的噪声限值是（ ）dB。

- A. 55
- B. 65
- C. 75
- D. 85

19. 【2013-90】在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确有（ ）。

- A. 用餐人数在 100 人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池
- B. 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网
- C. 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过 22 时，早晨作业不早于 6 时
- D. 施工现场外围设置 1.5m 高的围挡
- E. 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备

20. 【2020. 12-61】下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（ ）。

- A. 施工现场实行半封闭式管理
- B. 施工现场主要场地硬化处理
- C. 沿工地四周连续设置高度 1.6m 的围挡

D. 集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区

21. 【2020. 12-60】在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。

- A. 晚 10 时到次日早 7 时
- B. 晚 11 时到次日早 6 时
- C. 晚 10 时到次日早 6 时
- D. 晚 11 时到次日早 7 时

2Z106000 施工合同管理

2Z106010 施工发承包模式

1. 【2020-38】某地铁工程项目，发包人将 14 座车站的土建工程分别发包给 14 个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给 14 个机电安装单位，该发承包模式属于（ ）。

- A. 施工总承包
- B. 施工平行发承包
- C. 施工总承包管理
- D. 项目总承包

2. 【2020-39】施工招标过程中，若招标人在招标文件发布后，发现问题需要进一步澄清和修改，正确的说法是（ ）。

- A. 所有澄清文件必须以书面形式进行
- B. 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少 10 天前发出通知
- C. 可以用间接方式通知所有招标文件收受人
- D. 所有澄清和修改文件必须公示

3. 【2020-74】施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（ ）。

- A. 工作开展程序
- B. 总包单位承担的责任和义务
- C. 对分包单位的管理和服务
- D. 合同关系
- E. 合同计价方式

4. 【2019-43】关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。

- A. 支付给分包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位
- B. 业主对分包单位的选择没有控制权
- C. 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行
- D. 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价

5. 【2019-51】关于建设工程施工招标中评标说法，正确的是（ ）。


- A. 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
- B. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 1-3 人，并标明排列顺序
- C. 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理
- D. 初步评审是对投标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

6. 【2019-80】关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。

- A. 招标人对问题的答复函件须注明问题来源
- B. 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准
- C. 标前会议是招标人按投标须知在规定的地点召开的会议

- D. 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间
- E. 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人
7. 【2018-55】与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。
- A. 合同管理工作量增大
- B. 组织协调工作量增大
- C. 建设周期比较长，对项目总进度控制不利
- D. 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制
8. 【2018-94】关于建设工程施工和标前会议的说法，正确的有（ ）。
- A. 标前会议是招标人按投标须知在规定的时问，地点召开的会议
- B. 标前会议纪要与标文件不一致时，应依据标文件为准
- C. 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
- D. 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定长投标截止时间
- E. 招标人的答复函件对问超的答复须注明问来源
9. 【2017-11】施工平行发承包模式的特点是（ ）。
- A. 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制
- B. 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长
- C. 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商
- D. 业主招标工作量大，对业主不利
10. 【2017-58】关于施工投标的说法，正确的是（ ）。
- A. 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理
- B. 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定
- C. 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定
- D. 投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理
11. 【2017-70】关于建设工程施工招标评标说法，正确的是（ ）。
- A. 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
- B. 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理
- C. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 1~3 人，并标明排列顺序
- D. 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审
12. 【2017-89】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。
- A. 整个项目的合同总额确定较有依据
- B. 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价
- C. 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资
- D. 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标
- E. 业主对分包单位的选择具有控制权
13. 【2016-53】关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取
- B. 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包报单位的差价
- C. 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价
- D. 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价
14. 【2016-59】关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调
- B. 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平
- C. 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
- D. 业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调
15. 【2015-12】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（ ）。
- A. 监理单位委托 B. 投标竞争 C. 施工总承包人委托 D. 自行分配
16. 【2015-16】关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（ ）。
- A. 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利
- B. 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制
- C. 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期
- D. 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小
17. 【2015-89】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（ ）。
- A. 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少
- B. 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据
- C. 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
- D. 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价
- E. 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险
18. 【2014-59】某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（ ）。



- A. 施工平行发承包模式 B. 施工总承包模式
- C. 施工总承包管理模式 D. 建设项目工程总承包模式
19. 【2014-60】关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期
- B. 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利

- C. 增加的 30 万元因政策变化造成, 属于承包人的责任, 由承包人承担
- D. 工期延误是承包人原因, 增加的 30 万元是政策变化造成, 应由双方共同承担
2. 【2020-19】根据《标准施工招标文件》, 与当地公安部门协商, 在施工现场建立联防组织的主体是()。
- A. 承包人
B. 监理人
C. 项目所在地街道网
D. 发包人
3. 【2020-27】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》, 下列合同规定的相关义务中, 属于劳务分包人义务的是()。
- A. 组建项目管理班子
B. 投入人力和物力, 科学安排作业计划
C. 负责编制施工组织设计
D. 负责工程测量定位和沉降观测
4. 【2020-56】根据《标准施工招标文件》, 缺陷责任期最长不超过()年。
- A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
5. 【2020-87】根据《标准施工招标文件》, 关于工期调整的说法, 正确的有()。
- A. 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求, 承包人应采取措施, 增加费用由发包人承担
- B. 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误, 承包人有权要求发包人延长工期
- C. 承包人提前竣工建议被采纳的, 由承包人自行采取加快工程进度的措施, 发包人承担相应费用
- D. 发包人要求承包人提前竣工的, 应承担由此增加的费用, 并根据合同条款约定支付奖金
- E. 在合同履行过程中, 发包人改变某项工作的质量特性, 承包人有权要求延长工期
6. 【2019-25】根据《标准施工招标文件》, 关于暂停施工的说法, 正确的是()。
- A. 发包人原因造成暂停施工, 承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
- B. 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时, 承包人可以先暂停施工, 并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
- C. 施工过程中出现意外情况需要暂停施工的, 所有责任由发包人承担
- D. 由于发包人原因引起的暂停施工, 承包人有权要求延长工期和(或)增加费用, 但不得要求补偿利润
7. 【2019-26】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》, 关于专业分包的说法, 正确的是()。
- A. 分包工程合同不能采用固定价格合同
- B. 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系
- C. 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续, 并承担由此发生的费用
- D. 专业分包人只有在收到承包人的指令后, 才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地
8. 【2019-27】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》, 关于专业工程分包人做法, 正确的是()。
- A. 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令
- B. 可直接致函监理人, 要求对相关指令进行澄清
- C. 不能以任何理由直接致函给发包人
- D. 在接到监理人指令后, 可不执行承包人的指令

9. 【2019-62】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是（ ）。
- A. 为租赁使用的施工机械设备办理保险
 - B. 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险
 - C. 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险
 - D. 为从事危险作业的职工办理意外伤害险
10. 【2019-86】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。
- A. 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令
 - B. 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查
 - C. 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系
 - D. 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
 - E. 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收
11. 【2018-15】由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。
- A. 采购方收货戳记的日期
 - B. 供货方发送产品时承运单位签发的日期
 - C. 采购方向承运单位提出申请的日期
 - D. 供货方按照合同规定通知的提货日期
12. 【2018-27】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。
- A. 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人
 - B. 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并
 - C. 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用
 - D. 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用
13. 【2018-54】关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。
- A. 分包人服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
 - B. 分包人不能直接致函给发包人
 - C. 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
 - D. 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
14. 【2018-83】某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。
- A. 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工
 - B. 不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工
 - C. 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作
 - D. 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

E. 要求发包人延长工期，支付合理利润

15. 【2017-07】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，关于保险的说法，正确的是()。

- A. 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用
- B. 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用
- C. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用
- D. 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用

16. 【2017-25】根据《建设工程专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是()。

- A. 就分包工程可与发包人发生直接工作联系
- B. 就分包工程可与监理人发生直接工作联系
- C. 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令
- D. 就分包工程可直接致函给发包人或监理人

17. 【2017-32】根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由()承担。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理人
- D. 主管部门

18. 【2017-33】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-2013)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。

- A. 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用
- B. 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地
- C. 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系
- D. 分包工程合同不能采用固定价格合同

19. 【2017-36】根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人()。

- A. 工期和费用
- B. 工期、费用和利润
- C. 费用和利润
- D. 工期和利润

20. 【2016-29】下列合同履行情形中，属于发包人违约的情形是()。

- A. 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的
- B. 监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的
- C. 因地震造成工程停工的
- D. 发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的

21. 【2016-51】关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是()。

- A. 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任起算日期按实际竣工验收日期计算
- B. 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺

陷责任终止书，并退还剩余的质量保证金

C. 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作

D. 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月

22. 【2016-64】下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担的责任的是（ ）。

A. 业主方设计图纸延误造成的工程施工暂停

B. 为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工

C. 未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停

D. 迎接地方安全检查造成的工程施工暂停

23. 【2016-87】根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。

A. 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件

B. 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书

C. 监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作

D. 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决

E. 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人

24. 【2015-10】某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和(或)工期延误应由（ ）承担。

A. 发包人

B. 监理人

C. 承包人

D. 分包人

25. 【2015-14】某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（ ）。

A. 承包人负责办理，并承担有关费用

B. 承包人负责办理，发包人承担有关费用

C. 发包人负责办理，并承担有关费用

D. 发包人负责办理，承包人承担有关费用

26. 【2015-59】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（ ）。

A. 工程承包人办理并支付保险费用

B. 劳务分包人办理并支付保险费用

C. 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

D. 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

27. 【2015-93】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，专业工程分包人应承担违约责任的情形有（ ）。

A. 未履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任

B. 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏

C. 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

- D. 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令
- E. 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师
28. 【2014-61】根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（ ）。
- A. 按专用合同条款约定提供施工场地
- B. 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整
- C. 负责办理法律规定的有关施工证件和批件
- D. 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
29. 【2014-62】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，不属于承包人责任和义务的是（ ）。
- A. 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
- B. 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合
- C. 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要
- D. 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用
30. 【2014-63】根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。
- A. 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润
- B. 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
- C. 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
- D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
31. 【2014-91】关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（ ）。
- A. 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
- B. 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
- C. 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
- D. 采购方提货的，以采购方收货戳记日期为准
- E. 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
32. 【2013-63】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（ ）。
- A. 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
- B. 分包人可直接致电发包人或工程师
- C. 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令
- D. 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
33. 【2013-64】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包项目的施工组织设计应由（ ）负责编制。
- A. 发包人 B. 监理人 C. 承包人 D. 劳务分包人
34. 【2013-65】建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（ ）。

- A. 不属于国家定价的材料(产品)，由供方确定价格
- B. 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费
- C. 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准
- D. 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
35. 【2013-91】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，分包人的工作包括()。
- A. 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修
- B. 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用
- C. 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表
- D. 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
- E. 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作
36. 【2020. 12-67】根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是()。
- A. 增加的费用和工期延误由监理人承担
- B. 增加的费用和工期延误由承包人承担
- C. 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担
- D. 增加的费用和工期延误由发包人承担
37. 【2020. 12-84】根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的有()。
- A. 发包人在全部工程竣工前需使用已竣工的单位工程时可进行验收
- B. 单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
- C. 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程验收证书
- D. 在全部工程竣工前，已经签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管
- E. 承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告
38. 【2020. 12-08】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是()。
- A. 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系
- B. 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人
- C. 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令
- D. 分包人必须服从承包人与分包工程有关的指令
39. 【2020. 12-16】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于保险的说法，正确的是()。
- A. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险支付保险费用
- B. 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用
- C. 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用
- D. 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用

2Z106030 施工计价方式

1. 【2020-25】发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变

更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的 10%时，固定的报酬也要增加。此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。

- A. 成本加固定比例合同
- B. 成本加奖金合同
- C. 成本加固定费用合同
- D. 最大成本加费用合同

2. 【2020-51】某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是 1000m^3 ，综合单价是 600 元/ m^3 ，该分部工程招标控制价为 70 万元。实际施工完成合格工程量为 1500m^3 。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。

- A. 60.0
- B. 90.0
- C. 65.0
- D. 70.0

3. 【2020-85】采用变动总价合同时，对于建设周期两年以上的工程项目，需考虑引起价格变化的因素有（ ）。

- A. 劳务工资及材料费用的上涨
- B. 承包人用工制度的变化
- C. 燃料费及电力价格的变化
- D. 外汇汇率的波动
- E. 法规变化引起的工程费用上涨

4. 【2019-09】在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（ ）。

- A. 全部价格的风险，不包括工作量的风险
- B. 全部工作量的风险，不包括价格的风险
- C. 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险
- D. 全部工作量和价格的风险

5. 【2019-20】下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ）。

- A. 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目
- B. 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目
- C. 工程结构和技术简单的工程项目
- D. 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目

6. 【2019-61】关于单价合同的说法，正确的是（ ）。

- A. 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
- B. 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
- C. 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目
- D. 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担风险较小

7. 【2019-78】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。

- A. 承包人承担的损失超过其承受能力
- B. 外汇汇率变化影响合同价款
- C. 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时
- D. 工程造价管理部门公布的价格调整
- E. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

8. 【2018-23】某土方合同采用单价合同方式，投标综合单价为30万元，土方单价为30元/m²，清单工程量为6000m²，现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m²，则预算工程款应为（ ）万元。
- A. 15 B. 20 C. 30 D. 35
9. 【2018-32】对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（ ）。
- A. 有利于控制投资 B. 可通过分段施工缩短工期
- C. 不承担工程量变化的风险 D. 不需介入工程施工和管理
10. 【2018-51】某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（ ）。
- A. 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算
- B. 修改工程量后进行报价
- C. 按业主要求工程量修改单价后报价
- D. 采用不平衡报价法提高该项工程报价
11. 【2018-63】下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。
- A. 单价合同 B. 成本加酬金合同
- C. 固定总价合同 D. 变动总价合同
12. 【2018-86】若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。
- A. 报价计算错误的风险 B. 物价，人工费上调的风险
- C. 工程变更的风险 D. 设计深度不够导致误差的风险
- E. 投资失控的风险
13. 【2017-19】关于单价合同的说法，正确的是（ ）。
- A. 对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先做修改再评标
- B. 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险
- C. 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
- D. 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
14. 【2017-44】固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。
- A. 工程量错误 B. 工程范围不确定
- C. 漏报项目 D. 工程变更
15. 【2017-75】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（ ）。
- A. 施工方承担的损失超过其承受能力
- B. 一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时
- C. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
- D. 工程造价管理部门公布的价格调整
- E. 外汇汇率变化影响合同价款
16. 【2017-86】关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。

- A. 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算
- B. 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任
- C. 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和(或)损坏的原因
- D. 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作
- E. 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用
17. 【2016-34】下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ）。
- A. 工程结构和技术简单的工程项目
- B. 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目
- C. 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目
- D. 工程量暂不确定的工程项目
18. 【2016-44】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。
- A. 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的底点为工程成本估算的50%-95%
- B. 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%
- C. 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值
- D. 承包商在估算成本底点以下完成
19. 【2016-63】关于总价合同的说法，正确的是（ ）。
- A. 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间
- B. 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同
- C. 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整
- D. 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担
20. 【2016-71】某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为300000元；投标报价单的总价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。
- A. 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标
- B. 实际施工中工程量2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元
- C. 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对投标单价进行调整
- D. 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整
- E. 评标时应根据单价优先原则对总报价进行修改，正确报价应该为8400000元
21. 【2015-22】某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（ ）。
- A. 成本加固定费用合同
- B. 成本加固定比例费用合同
- C. 最大成本加费用合同
- D. 成本加奖金合同
22. 【2015-33】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（ ）。
- A. 单价合同
- B. 变动总价合同
- C. 成本加酬金合同
- D. 固定总价合同
23. 【2015-68】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际

结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（ ）为准。

- A. 签订的合同总价
B. 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和
C. 双方重新协商确定的单价和工程量
D. 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和

24. 【2015-82】在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（ ）。

- A. 管理费
B. 临时设施费
C. 暂定金额
D. 利润
E. 风险费

25. 【2014-64】在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（ ）。

- A. 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B. 全部工程量和通货膨胀的风险
C. 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D. 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

26. 【2014-65】关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。

- A. 采用该计价方式对业主的投资控制不利
B. 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程
C. 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同
D. 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高

27. 【2014-92】当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。

- A. 工程量发生较大的变化
B. 承包商自身成本发生较大的变化
C. 业主资金不到位
D. 通货膨胀达到一定水平
E. 国家相关政策发生变化

28. 【2014-93】成本加酬金合同的形式主要有（ ）。

- A. 最大成本加税金合同
B. 成本加固定费用合同
C. 成本加固定比例费用合同
D. 成本加奖金合同
E. 最大成本加费用合同

29. 【2013-66】采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ ）的特点。

- A. 工程量优先
B. 单价优先
C. 总价优先
D. 风险均摊

30. 【2013-67】某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（ ）万元。

项目	估价工程量(m ³)	实际工程量(m ³)	合同单价(元/m ³)
土方工程	4000	4200	--
石方工程	2800	3000	240

- A. 87.2
B. 88.2
C. 92.0
D. 93.0

31. 【2013-92】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-D201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（ ）。

- A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B. 工程造价管理部门公布的价格调整

- C. 市场价格的任何波动
- D. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h
- E. 与计划相比, 实际工程量变动超过一定幅度
32. 【2020. 12-83】关于单价合同的说法, 正确的有()。
- A. 业主需安排专门力量核实已完工程量, 协调工作量大
- B. 实际投资易超过计划投资, 对发包人投资控制不利
- C. 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目, 可采用固定单价合同
- D. 固定单价合同下, 任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险
- E. 单价合同允许随工程量变化调整总价, 承包商不存在量的风险
33. 【2020. 12-06】某合同约定, 合同价格为工程成本总价加固定酬金, 若实际成本超过合同中规定的成本总价, 超过部分由承包人承担; 若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的()。
- A. 成本加固定费用合同
- B. 成本加固定比例费用合同
- C. 成本加奖金合同
- D. 最大成本费用合同

2Z106040 施工合同执行过程的管理

1. 【2020-46】根据《标准施工招标文件》, 关于变更权的说法, 正确的是()。
- A. 没有监理人的变更指示, 承包人不得擅自变更
- B. 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示
- C. 监理人可根据实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示
- D. 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示
2. 【2020-95】在施工过程中, 引起工程变更的原因有()。
- A. 发包人修改项目计划
- B. 设计错误导致图纸修改
- C. 总承包人改变施工方案
- D. 工程环境变化
- E. 政府部门提出新的环保要求
3. 【2019-28】根据《标准施工招标文件》, 关于施工合同变更权和变更程序的说法, 正确的是()。
- A. 发包人可以直接向承包人发出变更意向书
- B. 承包人根据合同约定, 可以向监理人提出书面变更建议
- C. 承包人书面报告发包人后, 可根据实际情况对工程进行变更
- D. 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示
4. 【2019-57】下列合同实施偏差的调整措施中, 属于组织措施的是()。
- A. 增加人员投入
- B. 增加资金投入
- C. 采取索赔手段
- D. 变更合同条款
5. 【2019-83】根据《标准施工招标文件》, 在合同履行中可以进行工程变更的情形有()。
- A. 改变合同工程的标准
- B. 改变合同中某项工作的施工时间
- C. 为完成工程需要追加的额外工作
- D. 改变合同中某项工作的质量标准
- E. 取消合同中某项工作, 转由发包人实施

6. 【2018-38】根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。
- A. 14 B. 7 C. 28 D. 30
7. 【2018-81】下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。
- A. 产生偏差的原因分析 B. 实施偏差的责任分析
C. 合同实施趋势分析 D. 实施偏差的费用分析
E. 过程控制要求高
8. 【2017-18】根据九部委《标准施工招标文件》，对于施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无适用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。
- A. 固定总价 B. 固定单价 C. 可调单价 D. 成本加利润
9. 【2017-34】根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（ ）。
- A. 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更
B. 发包人可以直接向承包人发出变更意向书
C. 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示
D. 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议
10. 【2017-80】下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（ ）。
- A. 工程施工质量 B. 工程施工进度
C. 业主工程款项支付 D. 政府质量监督部门的质量检查
E. 施工成本的增加和减少
11. 【2016-46】下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（ ）。
- A. 项目管理团队绩效奖惩 B. 总工期的延误
C. 总成本的超支 D. 最终工程经济效益水平
12. 【2016-90】根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。
- A. 改变合同工程的标准 B. 改变合同中某项工作的施工时间
C. 改变合同中某项工作的质量标准 D. 为完成工程追加的额外工作
E. 取消合同中某项工作，转由发包人实施
13. 【2015-29】某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（ ）。
- A. 技术措施 B. 组织措施 C. 经济措施 D. 合同措施
14. 【2015-57】根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（ ）向承包人发出变更指令。
- A. 监理人 B. 业主 C. 设计人 D. 变更提出方
15. 【2015-74】根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（ ）。
- A. 目的 B. 范围

- C. 变更内容
D. 变更的工程量及其进度和技术需求
E. 变更程度
16. 【2014-66】根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（ ）。
A. 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施
B. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D. 为完成工程需要追加的额外工作
17. 【2014-67】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（ ）。
A. 不同项目合同偏差的对比
B. 合同实施趋势分析
C. 偏差的跟踪情况分析
D. 业主对合同偏差的态度分析
18. 【2013-68】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（ ）的变更指示，承包人不得擅自变更。
A. 业主
B. 设计人
C. 监理人
D. 规划主管部门
19. 【2013-93】根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（ ）。
A. 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人做出变更指令
B. 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中
C. 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议
D. 承包人在收到监理人做出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作
E. 承包人应在收到变更指示的第14 天内向监理人提交变更报价书
20. 【2020. 12-40】承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施于合同实施偏差处理中的（ ）。
A. 技术措施
B. 经济措施
C. 组织措施
D. 合同措施
21. 【2020. 12-34】某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施，该措施属于项目目标控制的（ ）。
A. 组织措施
B. 管理措施
C. 经济措施
D. 技术措施
22. 【2020. 12-63】根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。
A. 发包人与监理工程师
B. 监理工程师与合同当事人
C. 承包人与总监理工程师
D. 总监理工程师与合同当事人
23. 【2020. 12-82】根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（ ）。
A. 变更目的
B. 变更范围
C. 变更程序
D. 变更内容

E. 变更的工程量

2Z106050 施工合同的索赔

1. 【2020-47】施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（ ）。

- A. 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件
- B. 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件
- C. 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件
- D. 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件

2. 【2020-64】施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（ ）。

- A. 向发包人递交索赔报告
- B. 将索赔报告报监理工程师审查
- C. 向监理人递交索赔意向通知书
- D. 分析确定索赔额

【大立解析】施工承包人向发包人索赔的第一步工作是向监理人递交索赔意向通知书。

3. 【2020-76】根据《标准施工招标文件》，关于承包人索赔程序的说法，正确的有（ ）。

- A. 应在索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书
- B. 应在发出索赔意向通知书 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书
- C. 索赔事件具有连续影响的，应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知
- D. 有连续影响的，应在递交延续索赔通知书 28 天内与发包人谈判确定当期索赔的额度
- E. 有连续影响的，应在索赔事件影响活动结束后的 28 天内，向监理人递交最终索赔通知书

4. 【2019-11】根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（ ）。

- A. 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证
- B. 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内
- C. 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书
- D. 发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

5. 【2019-14】在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定时间内（ ）。

- A. 向发包人发出书面索赔意向通知
- B. 向工程建设行政主管部门报告
- C. 向造价工程师提交正式索赔报告
- D. 收集完善索赔证据

6. 【2019-82】建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。

- A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
- B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
- C. 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围
- D. 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围
- E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

7. 【2018-19】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。

- A. 收集准备索赔资料
- B. 编写法律诉讼文件
- C. 防止对方提出索赔
- D. 发出最终索赔通知

8. 【2018-21】政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。

- A. 造价鉴定机构
B. 造价咨询人
C. 监理人
D. 政府造价管理部门
9. 【2018-68】索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。
A. 质量、成本
B. 安全、工期
C. 工期、费用
D. 标准、信息
10. 【2018-79】建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。
A. 造成的费用增加数额已得到第三方核认
B. 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出
C. 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
D. 发包人按合同规定的时间回复索赔报告
E. 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告
11. 【2017-17】承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。
A. 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加
B. 承包商为了保证工程质量而增加的措施费
C. 分包商返工造成费用增加，工期拖延
D. 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延
12. 【2017-50】根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（ ）。
A. 按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
B. 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
C. 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
D. 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
13. 【2017-83】下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。
A. 施工合同文件
B. 工程各项会议纪要
C. 监理工程师的口头指示
D. 相关法律法规
E. 施工日记和现场记录
14. 【2016-23】关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。
A. 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B. 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人
C. 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
D. 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
15. 【2016-47】关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。
A. 承包人可以直接向业主提出索赔要求
B. 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
C. 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
D. 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚

16. 【2016-83】可以作为施工合同索赔证据的工程资料有（ ）。
A. 业主的口头指示
B. 施工标准和技术规范
C. 工程会议纪要
D. 官方发布的物价指数
E. 施工技术交底书
17. 【2015-36】根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（ ）审核。
A. 业主
B. 设计人
C. 项目经理
D. 监理人
18. 【2015-38】工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（ ）。
A. 向监理工程师提出索赔意向通知
B. 向监理工程师提交索赔依据
C. 向监理工程师提交索赔报告
D. 与业主就索赔事项进行谈判
19. 【2015-72】承包商可以提出索赔的条件有（ ）。
A. 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
B. 因工程变更造成的时间、费用损失
C. 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
D. 货款利率上调造成贷款利息增加
E. 发包人延误支付期限造成承包人的损失
20. 【2014-68】工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。
A. 提交索赔证据
B. 提出索赔意向通知
C. 暂停施工
D. 与业主就索赔事项进行谈判
21. 【2014-69】根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ ）。
A. 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知
B. 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C. 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料
D. 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书
22. 【2014-94】承包商索赔成立应具备的前提条件有（ ）。
A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围
E. 索赔费用计算正确，并且容易分析
23. 【2013-69】关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（ ）。
A. 导致索赔的事情必须是对方的过错，索赔才能成立
B. 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C. 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
D. 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立

24. 【2013-94】 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（ ）。
A. 索赔证据
B. 索赔事件总述
C. 索赔合理性论证
D. 索赔款项(或工期)计算书
E. 索赔意向通知
25. 【2020. 12-64】 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（ ）。
A. 监理人批准的施工方案
B. 承包人进场材料合格证书
D. 发包人审批的施工进度计划
C. 标准和技术规范
26. 【2020. 12-73】 下列干扰事件中， 承包人可以进行索赔的有（ ）。
A. 承包人选择的分包人不能按时进场施工
B. 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格
C. 发包人要求提前完成项目或者缩短工期
D. 承包人为项目创优而自主增加投入
E. 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展
27. 【2020. 12-13】 根据《标准施工招标文件》， 合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件， 承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。
A. 承包人接受竣工付款证书之日
B. 发包人颁发工程接收证书之日
C. 承包人提交最终结清申请单之日
D. 发包人实际支付竣工结算价款之日

2Z106060 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

1. 【2020-12】 施工合同履行过程中， 发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的（ ）。
A. 项目外界环境风险
B. 管理风险
C. 合同信用风险
D. 合同工程风险
2. 【2020-42】 根据《建设工程施工合同(示范文本)》， 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 3%
3. 【2019-33】 根据《建设工程施工合同(示范文本)》， 承包人提供质量保证金的方式原则上应为（ ）。
A. 相应比例的工程款
B. 相应额度的担保物
C. 质量保证金保函
D. 相应额度的现金
4. 【2019-41】 根据《建设工程施工合同(示范文本)》， 招标人要求中标人提供履约担保时， 招标人应同时向中标人提供的担保是（ ）。
A. 履约担保
B. 预付款担保
C. 工程款支付担保
D. 资金来源证明
5. 【2019-47】 下列施工工程合同风险产生的原因中， 属于合同工程风险的是（ ）。
A. 非法分包
B. 物价上涨
C. 偷工减料
D. 恶意拖欠
6. 【2020. 12-17】 下列工程合同风险中， 属于合同信用风险的是（ ）。
A. 工程变更风险
B. 物价上涨风险

- C. 非法分包风险 D. 不可抗力风险
7. 【2020.12-62】为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（ ）办理。
- A. 监理人 B. 项目法人
- C. 项目承包人 D. 项目主管部门

2Z107000 施工信息管理

2Z107010~7020

1. 【2020-09】下列工作内容中，不属于 BIM 技术应用方面的是（ ）。
- A. 进行管理碰撞检查 B. 进行定向设计
- C. 进行企业人力资源管理 D. 进行可视化演示
2. 【2020-75】根据《建设工程文件归档规范》，建设工程文件应包括（ ）。
- A. 工程准备阶段文件 B. 监理文件
- C. 前期投资策划文件 D. 施工文件
- E. 竣工图和竣工验收文件
3. 【2019-42】下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是（ ）。
- A. 施工试验记录 B. 隐蔽工程验收记录
- C. 主体结构验收记录 D. 材料设备进场记录
4. 【2019-93】下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。
- A. 归档文件应为原件
- B. 竣工图章尺寸为60mm×80mm
- C. 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅
- D. 所有竣工图均应加盖竣工图章
- E. 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据
5. 【2018-09】关于建设工程施工文件归档质量要求的说法正确的是（ ）。
- A. 归档文件用原件和复印件均可
- B. 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面
- C. 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求
- D. 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制
6. 【2018-75】根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。
- A. 按规范要求统一折叠 B. 由建设单位负责编制
- C. 编制总说明及专业说明 D. 有一般性变更时必须重新控制
- E. 真实反映项目竣工验收时实际情况
7. 【2017-08】下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（ ）。
- A. 与建筑业有关的专家信息 B. 建设物资的市场信息
- C. 与合同有关的信息 D. 与施工有关的技术信息

8. 【2017-71】下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（ ）。
A. 工程项目原材料检验报告 B. 施工试验记录
C. 工程质量事故记录文件 D. 隐蔽工程验收记录文件
E. 交接检查记录
9. 【2016-21】国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（ ）。
A. 技术标准 B. 工程档案管理制度
C. 信息编码体系 D. 信息管理手册
10. 【2016-76】关于施工文件归档的说法，正确的有（ ）。
A. 归档可以分阶段分期进行 B. 工程档案一般不少于两套
C. 工程档案原件由建设单位保管 D. 监理工程师应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查
E. 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档
11. 【2015-31】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（ ）。
A. 公共信息 B. 项目管理信息 C. 工作总体信息 D. 施工信息
12. 【2015-79】下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（ ）。
A. 见证检测报告 B. 施工组织设计 C. 交接检查记录
D. 施工测量放线报验表 E. 检验批质量验收记录
13. 【2014-70】关于建设工程信息管理内涵的说法，正确的是（ ）。
A. 信息管理是指信息的收集和整理
B. 信息管理的目的是有效反映工程项目管理的实际情况
C. 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息
D. 建设工程项目信息交流的问题会不同程度地影响项目目标的实现
14. 【2014-95】下列施工文件档案资料中，属于工程质量控制资料的有（ ）。
A. 施工测量放线报验表 B. 水泥见证验测报告
C. 交接检查记录 D. 检验批质量验收质量表
E. 竣工验收证明书
15. 【2013-70】施工方信息管理手段的核心是（ ）。
A. 实现工程管理信息化 B. 编制信息管理手册
C. 建立基于互联网的信息处理平台 D. 实现办公自动化
16. 【2013-95】施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（ ）。
A. 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作
B. 按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织编制工作
C. 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
D. 及时将施工档案资料移交建设单位
E. 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门
17. 【2020.12-69】下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。

- A. 材料设备进场记录
- B. 施工日志记录
- C. 主要构配件的试验报告
- D. 质量检查记录

18. 【2020. 12-90】关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 竣工图纸必须采用国家标准图幅
- B. 归档的文件应为原件
- C. 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面
- D. 所有竣工图均应加盖竣工图章
- E. 竣工图应是新蓝图
